



**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng




PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN STATUS JULI TAHUN ANGGARAN 2026

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


POSTUR ANGGARAN TAHUN 2026

APBD MURNI


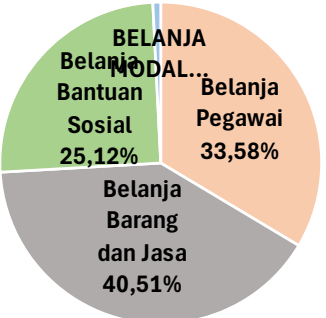


URAIAN	APBD MURNI	PENYESUAIAN	SELISIH	
BELANJA OPERASI	39.495.871.000	38.796.129.000	-699.742.000	-1,77%
Belanja Pegawai	13.368.944.000	13.368.944.000	0	0,00%
Belanja Barang dan Jasa	16.126.927.000	15.427.185.000	-699.742.000	-4,34%
Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0,00%
BELANJA MODAL	315.000.000	314.860.000	-140.000	-0,04%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000	64.860.000	-140.000	-0,22%
Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	250.000.000	0	0,00%
JUMLAH BELANJA	39.810.871.000	39.110.989.000	-699.882.000	-1,76%


PENYESUAIAN

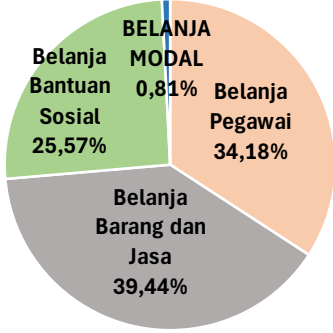


UNIT KERJA/PROGRAM	APBD MURNI (Rp)	PENYESUAIAN APBD (Rp)	SELISIH	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	39.810.871.000	39.110.989.000	-699.882.000	-1,76%
SEKRETARIAT DINAS	19.491.548.000	19.287.148.000	-204.400.000	-1,05%
01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.491.548.000	19.287.148.000	-204.400.000	-1,05%
BIDANG PERUMAHAN	12.827.000.000	12.634.852.000	-192.148.000	-1,50%
02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	12.827.000.000	12.634.852.000	-192.148.000	-1,50%
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	4.687.023.000	4.620.773.000	-66.250.000	-1,41%
03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.024.023.000	1.968.241.000	-55.782.000	-2,76%
05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.663.000.000	2.652.532.000	-10.468.000	-0,39%
BIDANG PERTANAHAN	1.208.000.000	1.088.143.000	-119.857.000	-9,92%
03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	272.000.000	237.960.000	-34.040.000	-12,51%
04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	503.000.000	458.084.000	-44.916.000	-8,93%
06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	433.000.000	392.099.000	-40.901.000	-9,45%
BIDANG PERENCANAAN TEKNIS PKP	1.597.300.000	1.480.073.000	-117.227.000	-7,34%
03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.227.300.000	1.156.974.000	-70.326.000	-5,73%
06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PKP	370.000.000	323.099.000	-46.901.000	-12,68%

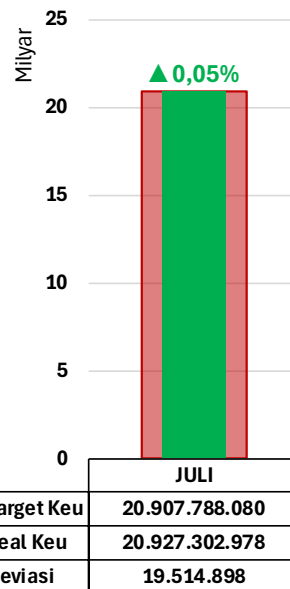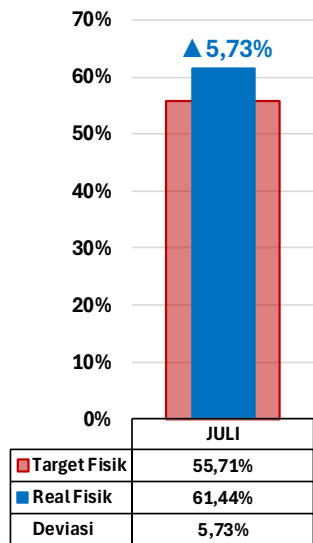

PROGRES FISIK

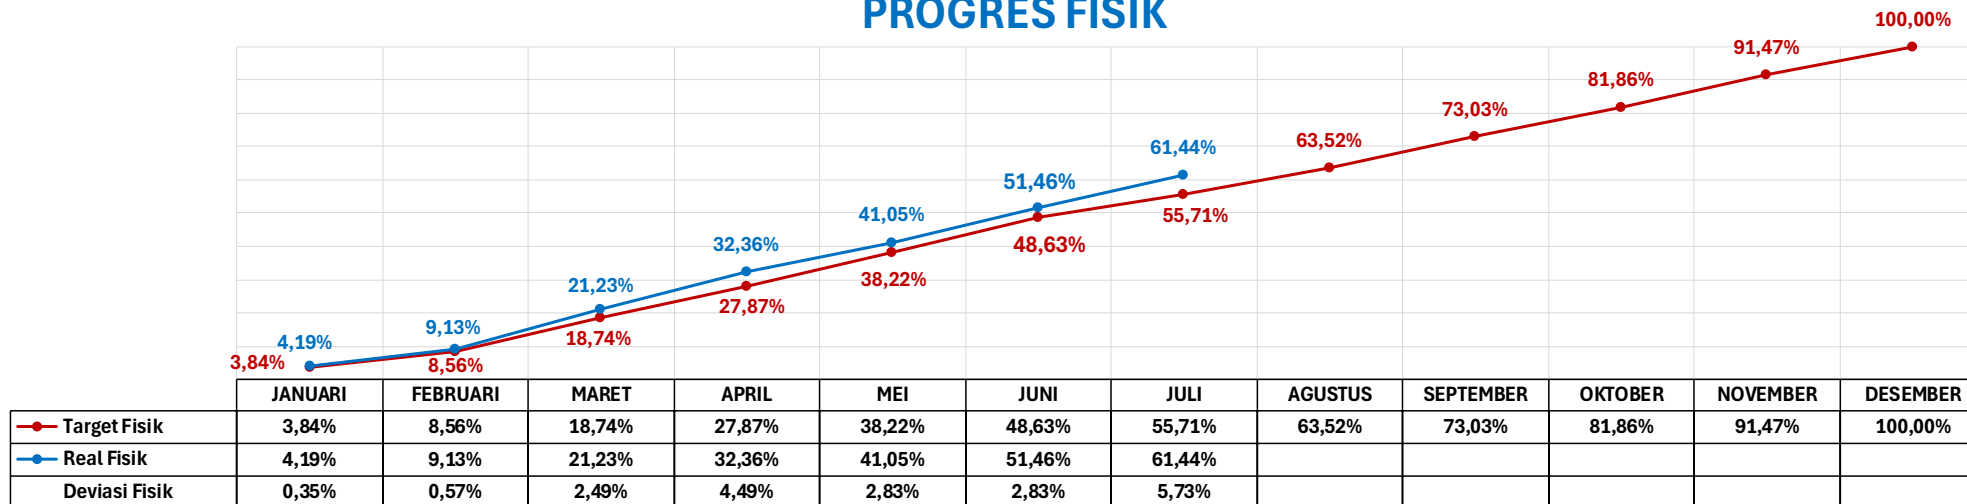


PROGRES KEUANGAN

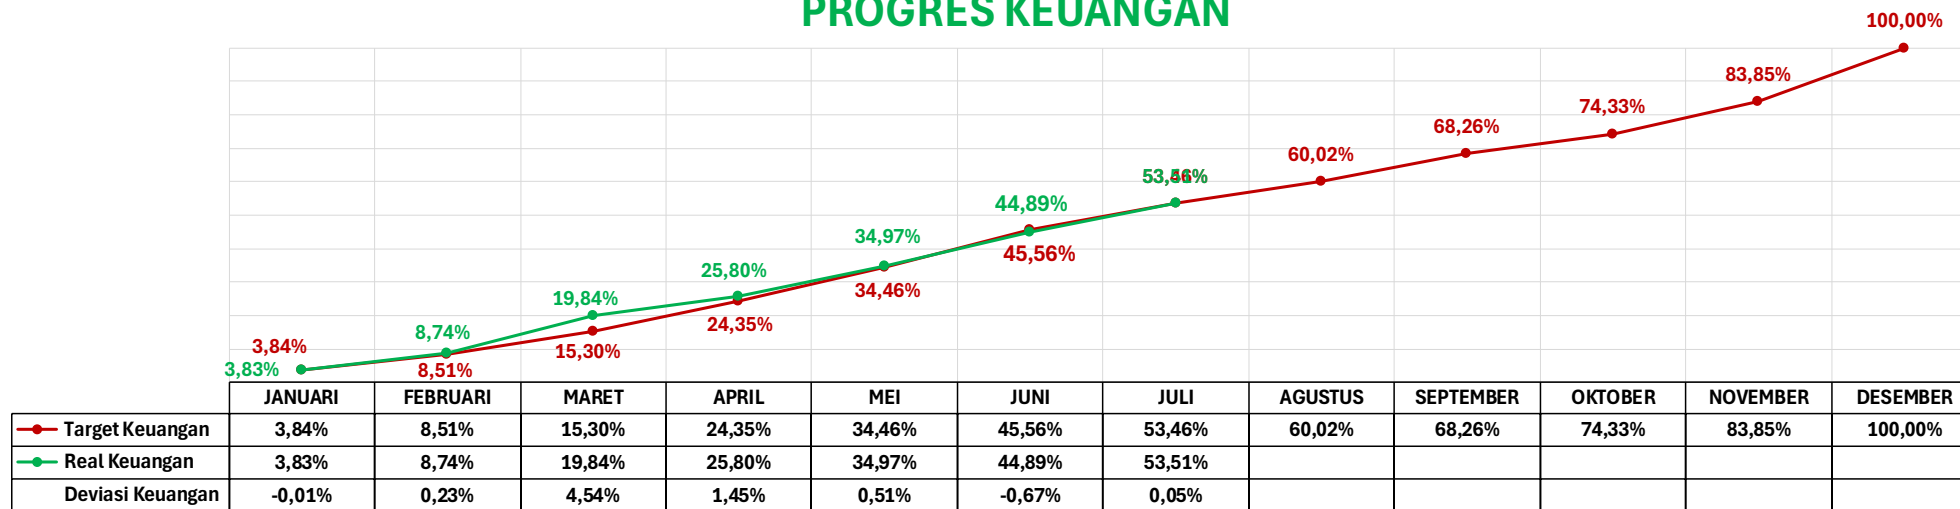


REKAP PROGRES PROVINSI


REALISASI FISIK

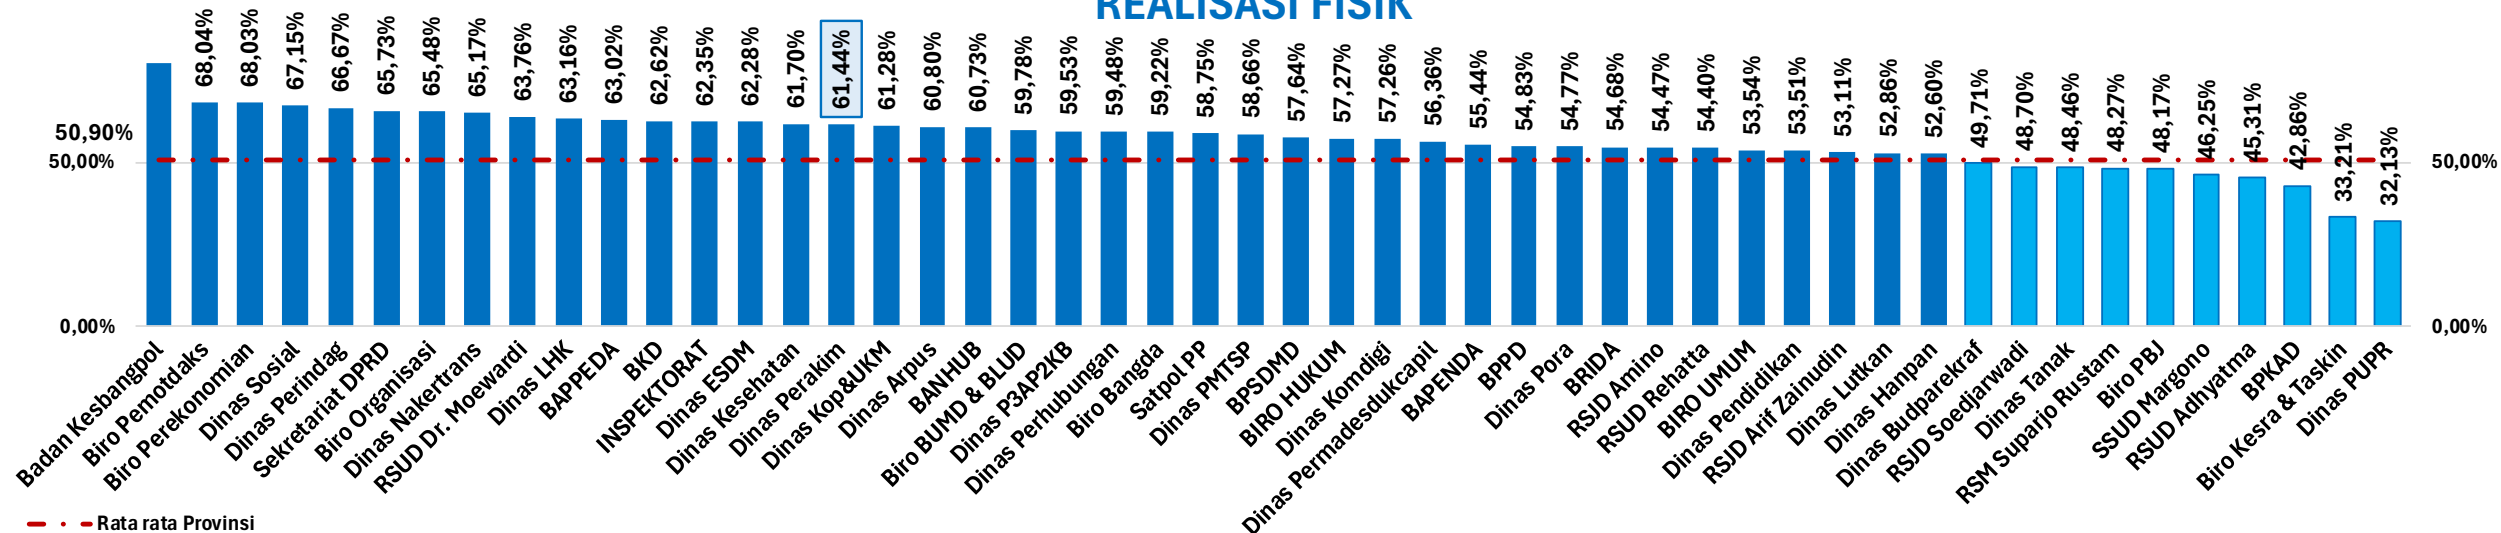

REALISASI KEUANGAN

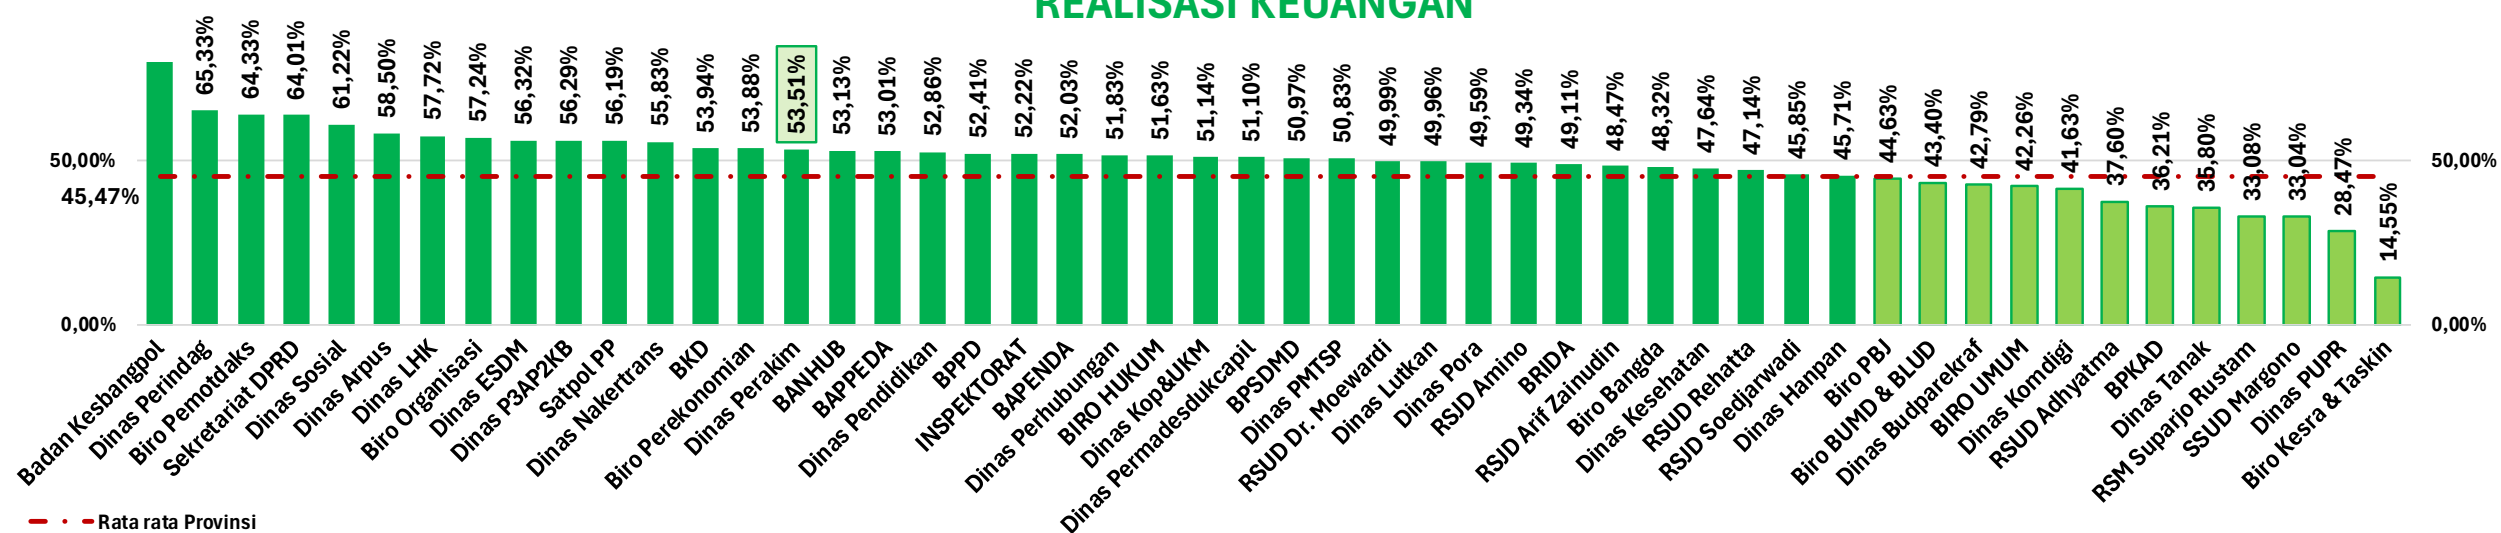


PROGRES REALISASI BELANJA PER PROGRAM

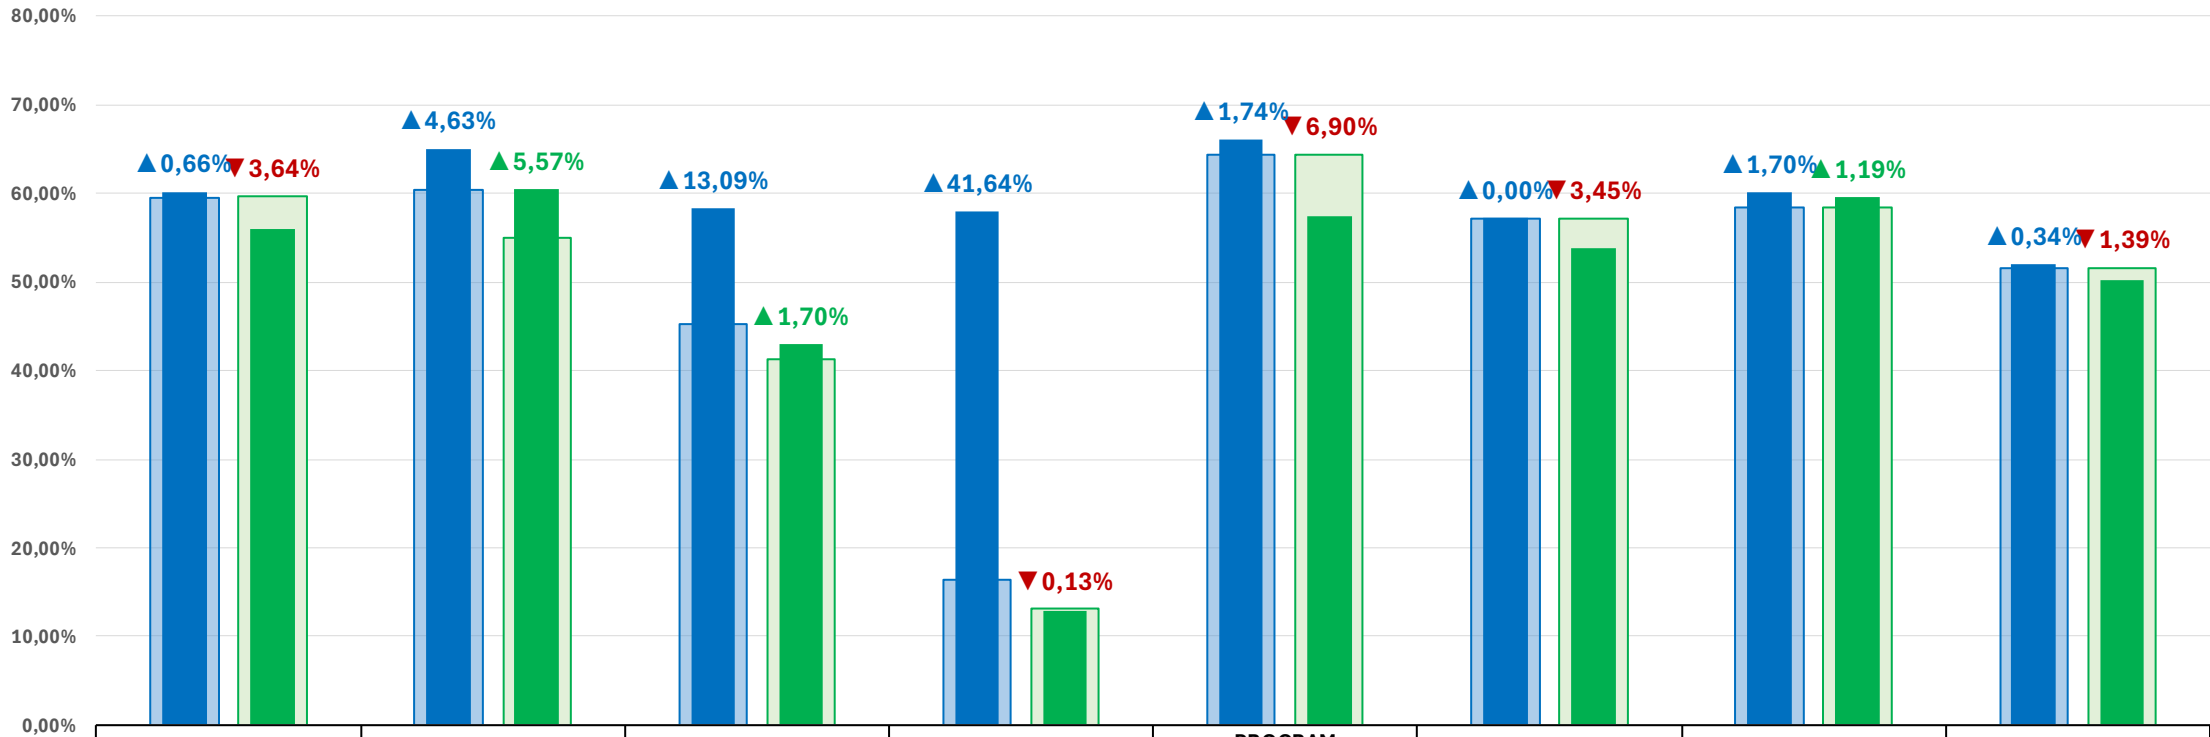

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
TARGET FISIK	59,55%	60,47%	45,30%	16,36%	64,42%	57,19%	58,43%	51,63%
TARGET KEUANGAN	59,68%	54,97%	41,30%	13,10%	64,40%	57,19%	58,43%	51,63%
REALISASI FISIK	60,21%	65,10%	58,39%	58,01%	66,16%	57,19%	60,13%	51,97%
REALISASI KEUANGAN	56,04%	60,53%	43,00%	12,97%	57,50%	53,75%	59,62%	50,24%

PROGRES REALISASI BELANJA UNIT KERJA

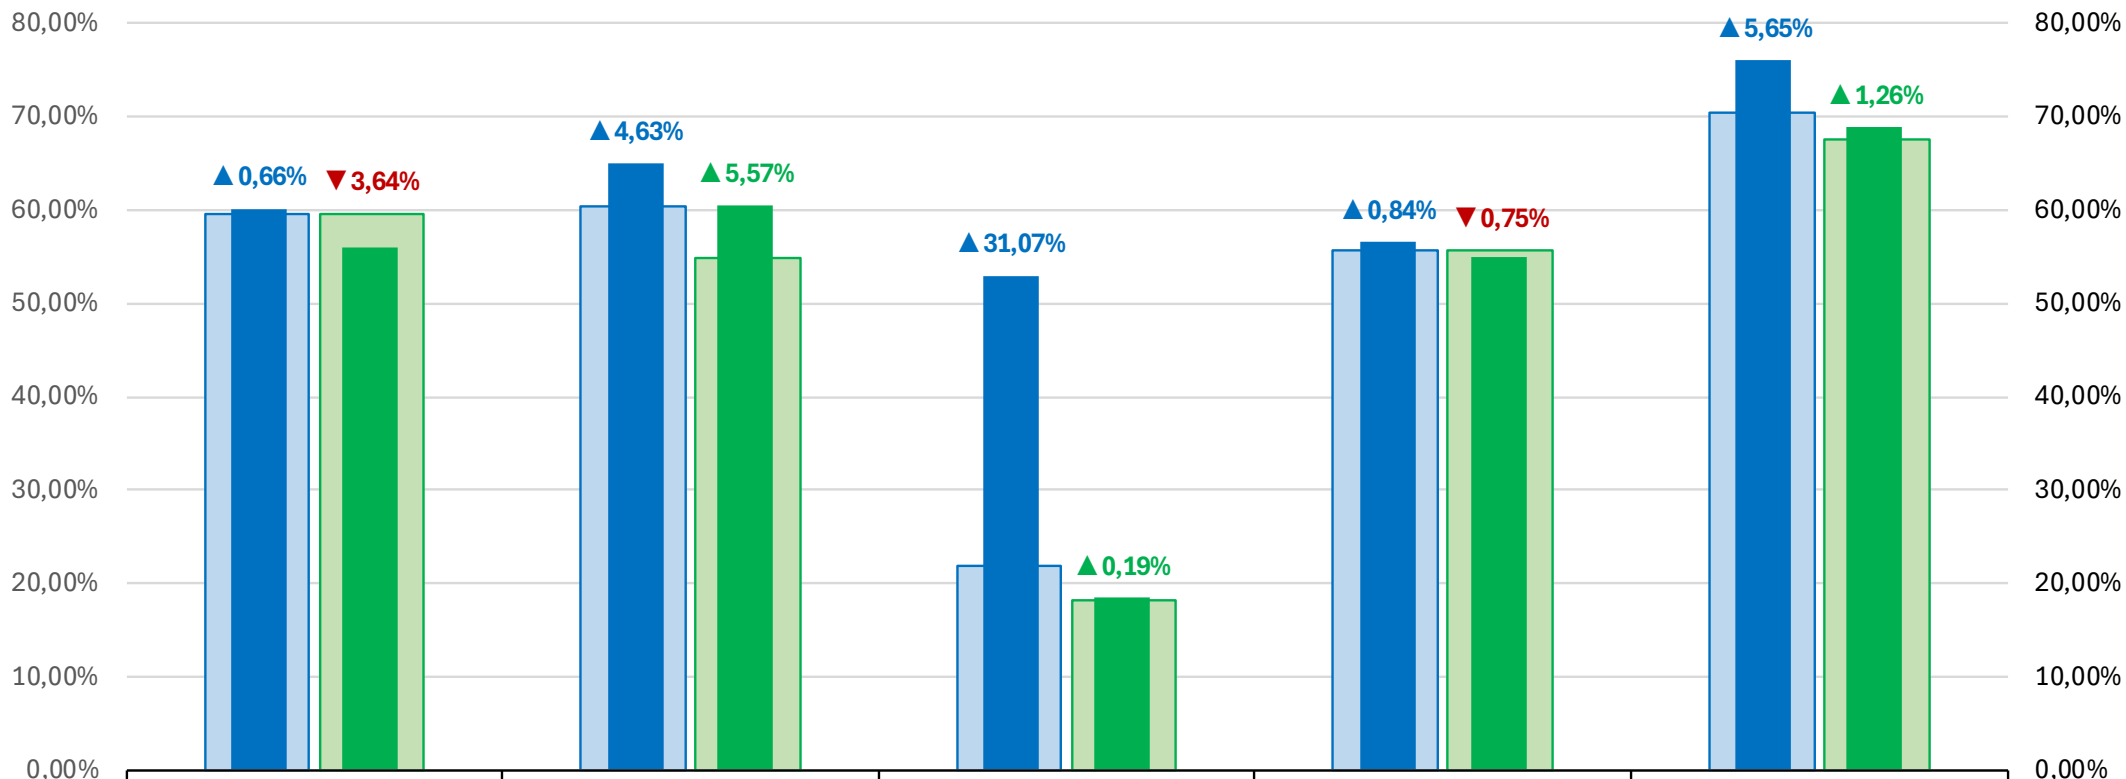

	Sekretariat - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan	Bidang Kawasan Permukiman	Bidang Pertanahan	Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target Fisik (%)	59,55	60,47	21,97	55,71	70,44
Target Keuangan (%)	59,68	54,97	18,30	55,71	67,61
Realisasi Fisik (%)	60,21	65,10	53,04	56,55	76,09
Realisasi Keuangan (%)	56,04	60,53	18,49	54,96	68,87

No	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Kontrak	Tanggal Selesai Kontrak	Progres Juni	Progres Juli	Progres Fisik Pekerjaan (%)	Progres Pencairan (Rp)	BIDANG
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Website Dinas	Pengadaan langsung	50.000.000	49.822.350	12-Jun-26	2 bulan	13 Agustus 2026	Sudah Terkontrak 12 Juni 2026	Pelaksanaan Pekerjaan	75,00%	-	Sekretariat
2	Pemeliharaan / maintenance Sistem Beranda Ngumah	Pengadaan langsung	50.000.000					Dirasionalisasi		0,00%	-	Sekretariat
3	Updating Aplikasi Simperum	Pengadaan langsung	90.000.000	85.220.800	16-Mar-26	6 bulan	12 September 2026	Pelaksanaan	Laporan Antara pada tanggal 9 Juli 2026	60,00%	-	Perumahan
4	Maintenance Aplikasi Simperum	Pengadaan langsung	50.000.000	49.448.000	30-Mar-26	3 bulan	30 Juni 2026	Pelaksanaan	Laporan Akhir pada tanggal 9 Juli 2026	100,00%	-	Perumahan
5.a	Bansos Pengadaan Barang Rumah Apung di Kab. Demak Tahap 1 - PB Bencana (Grouping Plumbing)	E-Purchasing	1.440.000.000	30.992.310	14 Juli 2026	45 hari	27 Agustus 2026	Persiapan E-Purchasing	Terkontrak untuk materia Grouping Plumbing	0,00%	-	Perumahan
5.b	Bansos Pengadaan Barang Rumah Apung di Kab. Demak Tahap 1 - PB Bencana (Grouping Kayu)	E-Purchasing		628.420.950	28 Juli 2026	60 hari	25 September 2026	Persiapan E-Purchasing	Terkontrak untuk material Grouping Kayu	0,00%	-	Perumahan
5.c	Bansos Pengadaan Barang Rumah Apung di Kab. Demak Tahap 1 - PB Bencana (Grouping Non Kayu)	E-Purchasing							Persiapan E-Purchasing (Minggu ke-1 Agustus tahap negosiasi, Minggu ke-2 Agustus Kontrak - masa pekerjaan 90 hari)	0,00%	-	Perumahan

REKAP PENGADAAN KONTRAKTUAL

No	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Kontrak	Tanggal Selesai Kontrak	Progres Juni	Progres Juli	Progres Fisik Pekerjaan (%)	Progres Pencairan (Rp)	BIDANG
6	Bansos Pengadaan Barang Rumah Apung di Kab. Demak Tahap 2 - PB Bencana	E-Purchasing	1.280.000.000							0,00%	-	Perumahan
7	Konsultansi Verifikasi dan Validasi Data Backlog Kelayakan Kabupaten Demak	Pengadaan langsung	98.000.000	97.776.000	6 Maret 2026	3 bulan	22 Juni 2026	Penyusunan Laporan Akhir Serah Terima Pekerjaan Proses Pencairan	Pekerjaan Selesai, Pencairan Pembayaran	100,00%	96.903.000	Perencanaan Teknis
8	Konsultansi Verifikasi dan Validasi Data Backlog Kelayakan Kabupaten Grobogan	Pengadaan langsung	98.000.000	97.899.000	6 Maret 2026	3 bulan	22 Juni 2026	Penyusunan Laporan Akhir Serah Terima Pekerjaan Proses Pencairan	Pekerjaan Selesai, Pencairan Pembayaran	100,00%	97.025.100	Perencanaan Teknis
9	Konsultansi Verifikasi dan Validasi Data Backlog Kelayakan Kabupaten Rembang	Pengadaan langsung	98.000.000	97.868.000	6 Maret 2026	3 bulan	22 Juni 2026	Penyusunan Laporan Akhir Serah Terima Pekerjaan Proses Pencairan	Pekerjaan Selesai, Pencairan Pembayaran	100,00%	96.995.130	Perencanaan Teknis
10	Konsultansi Verifikasi dan Validasi Data Backlog Kelayakan Kabupaten Wonosobo	Pengadaan langsung	98.000.000	97.969.000	6 Maret 2026	3 bulan	22 Juni 2026	Penyusunan Laporan Akhir Serah Terima Pekerjaan Proses Pencairan	Pekerjaan Selesai, Pencairan Pembayaran	100,00%	97.095.030	Perencanaan Teknis
11	Konsultansi Verifikasi dan Validasi Data Backlog Kelayakan Kabupaten Sukoharjo	Pengadaan langsung	98.000.000	97.664.000	6 Maret 2026	3 bulan	22 Juni 2026	Penyusunan Laporan Akhir Serah Terima Pekerjaan Proses Pencairan	Pekerjaan Selesai, Pencairan Pembayaran	100,00%	96.792.000	Perencanaan Teknis

No	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Kontrak	Tanggal Selesai Kontrak	Progres Juni	Progres Juli	Progres Fisik Pekerjaan (%)	Progres Pencairan (Rp)	BIDANG
12	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi (Klinik PKP)	Pengadaan langsung	70.000.000	69.186.300	16 April 2026	150 hari	11 September 2026	Pelaksanaan	Pelaksanaan	60,00%	-	Perencanaan Teknis
13	Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman (Sikaper)	Pengadaan langsung	90.000.000	86.908.560	13 April 2026	75 hari	27 Juni 2026	Selesai pekerjaan	Pekerjaan Selesai	100,00%	86.908.560	Kawasan Permukiman
14	DED Paket 1: Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kab. Semarang berupa saluran drainase lingkungan	Pengadaan langsung	37.958.000	35.848.338	6 April 2026	30 hari	6 Mei 2026	Pekerjaan Selesai	Pekerjaan Selesai	100,00%	28.678.670	Kawasan Permukiman
15	DED Paket 2: Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kab. Kebumen berupa drainase dan jalan lingkungan	Pengadaan langsung	37.958.000	36.747.438	6 April 2026	30 hari	6 Mei 2026	Pekerjaan Selesai	Pekerjaan Selesai	100,00%	29.397.950	Kawasan Permukiman
16	DED Paket 3: Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kab. Pekalongan berupa jalan lingkungan	Pengadaan langsung	37.958.000	36.655.863	6 April 2026	30 hari	6 Mei 2026	Pekerjaan Selesai	Pekerjaan Selesai	100,00%	29.324.690	Kawasan Permukiman

No	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Kontrak	Tanggal Selesai Kontrak	Progres Juni	Progres Juli	Progres Fisik Pekerjaan (%)	Progres Pencairan (Rp)	BIDANG
17	Pengawasan Pekerjaan Paket 1: Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kab. Semarang berupa saluran drainase lingkungan	Pengadaan langsung	31.081.000	30.575.616	2 Juli 2026	90 hari	29 September 2026	Proses PL Pengawasan	Terkontrak	34,29%	-	Kawasan Permukiman
18	Pengawasan Pekerjaan Paket 2: Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kab. Kebumen berupa drainase dan jalan lingkungan	Pengadaan langsung	31.081.000	30.553.416	3 Juli 2026	90 hari	30 September 2026	Proses PL Pengawasan	Terkontrak	17,46%	-	Kawasan Permukiman
19	Pengawasan Pekerjaan Paket 3: Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kab. Pekalongan berupa jalan lingkungan	Pengadaan langsung	31.081.000	25.896.966	6 Juli 2026	60 hari	3 September 2026	Proses PL Pengawasan	Terkontrak	79,68%	-	Kawasan Permukiman
20	Pekerjaan Fisik Konstruksi Paket 1: Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kab. Semarang berupa saluran drainase lingkungan	Pengadaan langsung	400.000.000	392.324.132	2 Juli 2026	90 hari	29 September 2026	Proses PL Konstruksi	Terkontrak	34,29%	-	Kawasan Permukiman

No	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Kontrak	Tanggal Selesai Kontrak	Progres Juni	Progres Juli	Progres Fisik Pekerjaan (%)	Progres Pencairan (Rp)	BIDANG
21	Pekerjaan Fisik Konstruksi Paket 2: Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kab. Kebumen berupa drainase dan jalan lingkungan	Pengadaan langsung	400.000.000	396.571.039	3 Juli 2026	90 hari	30 September 2026	Proses PL Konstruksi	Terkontrak	17,46%	-	Kawasan Permukiman
22	Pekerjaan Fisik Konstruksi Paket 3: Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kab. Pekalongan berupa jalan lingkungan	Pengadaan langsung	400.000.000	396.571.039	6 Juli 2026	60 hari	03 September 2026	Proses PL Konstruksi	Terkontrak	79,68%	-	Kawasan Permukiman
23	DED Paket 1: Penyediaan prasarana permukiman Jalan Panggung dan MCK Komunal di Ds. Timbulsloko	Pengadaan langsung	71.420.000	70.473.648	02-Feb-26	30 hari	04 Maret 2026	Pekerjaan Selesai	Pekerjaan Selesai	100,00%	55.875.535	Kawasan Permukiman
24	DED Paket 2: Penyediaan prasarana permukiman talud jalan di Ds. Timbulsloko	Pengadaan langsung	73.404.000	72.655.184	02-Feb-26	45 hari	19 Maret 2026	Pekerjaan Selesai	Pekerjaan Selesai	100,00%	57.605.181	Kawasan Permukiman

No	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Kontrak	Tanggal Selesai Kontrak	Progres Juni	Progres Juli	Progres Fisik Pekerjaan (%)	Progres Pencairan (Rp)	BIDANG
25	Pengawasan Paket 1: Penyediaan prasarana permukiman Jalan Panggung dan MCK Komunal di Ds. Timbulsloko	Pengadaan langsung	51.158.000	50.323.182	10-Jun-26	90 hari	07 September 2026	Terkontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	34,81%	-	Kawasan Permukiman
26	Pengawasan Paket 2: Penyediaan prasarana permukiman talud jalan di Ds. Timbulsloko	Pengadaan langsung	52.573.000	51.027.810	23-Jun-26	120 hari	20 Oktober 2026	Terkontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	19,14%	-	Kawasan Permukiman
27	Pekerjaan Fisik Konstruksi Paket 1: Penyediaan prasarana permukiman Jalan Panggung dan MCK Komunal di Ds. Timbulsloko	Tender	951.179.000	839.196.863	10-Jun-26	90 hari	07 September 2026	Terkontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	34,81%	-	Kawasan Permukiman
28	Pekerjaan Fisik Konstruksi Paket 2: Penyediaan prasarana permukiman talud jalan di Ds. Timbulsloko	Tender	1.174.432.000	1.174.432.000	1.174.432.000	120 hari	20 Oktober 2026	Terkontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	19,14%	-	Kawasan Permukiman
29	Penyediaan Sarana Permukiman (4 unit motor pengangkut sampah)	e-Purchasing	200.000.000	183.210.000	07-Apr-26	30 hari	07 Mei 2026	Pekerjaan Selesai	Pekerjaan Selesai	100,00%	183.210.000	Kawasan Permukiman

Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana

	JULI	AGUSTUS
Target: 74 Realisasi: 40 Progres Fisik Peny. Bansos: 84,73% Realisasi Keuangan: Rp 1.254.000.000 (84,73%)	- Penyaluran termin 3 Kab Demak dan Kendal - Pengiriman material Kab. Demak dan Pemalang - Monev pembangunan di Kab. Demak dan Pemalang	- Penyaluran Termin 3 Kab. Pemalang - Pengiriman material Kab. Pemalang - Monev pembangunan Kab. Pemalang



PK Bencana di Desa Mojo, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang

NO	KAB/KOTA	ALOKASI	POTENSI GAGAL	PROGRES	
				PENGIRIMAN MATERIAL	TERBANGUN
1	Demak	41	7	34	21
2	Pemalang	28	2	26	15
3	Kendal	4	0	4	4
Total		74	9	64	40

Pembangunan Rumah Terdampak Bencana – Rumah Apung

	JULI	AGUSTUS
Target: 17 Realisasi: 0	Proses pengadaan rumah apung (plumbing dan komponen kayu sudah terkontrak)	- Proses pengadaan material non kayu rumah apung - Dropping material plumbing dan komponen kayu - Pengiriman material plumbing untuk rumah apung

NO	KAB/KOTA	ALOKASI	POTENSI GAGAL	RUSPIN		NON RUSPIN		SELESAI
				KIRIM	BANGUN	KIRIM	BANGUN	
1	Demak	17	8	0	0	0	0	0

Pembangunan Rumah Terdampak Bencana – Rumah Tapak

	JULI	AGUSTUS
Target: 20 Realisasi: 0	- Pengiriman Ruspun dan Non Ruspun Kab. Brebes	- Pengiriman Non Ruspun Kab. Brebes
Progres Fisik Peny. Bansos: 16,02% Realisasi Keuangan: Rp 360.000.000 (9,68%)	- Monev pembangunan Ruspun dan pengiriman material	

NO	KAB/KOTA	ALOKASI	POTENSI GAGAL	RUSPIN		NON RUSPIN		SELESAI
				KIRIM	BANGUN	KIRIM	BANGUN	
1	Purbalingga	2	2	0	0	0	0	0
2	Brebes	18	0	18	18	1	0	0
Total		20	2	18	18	1	0	0



PB Bencana di Desa Sridadi, Kec. Sirampog, Kab. Brebes

Pembangunan Rumah Terdampak Relokasi Program Pemerintah

	JULI	AGUSTUS
Target: 20 Realisasi: 6 Progres Fisik Peny. Bansos: 95,00% Realisasi Keuangan: Rp 760.000.000 (95,00%)	- Pengiriman Material Non Ruspun Kab. Cilacap - Pencairan termin 2 Kab. Cilacap - Proses pembangunan Kab. Purbalingga	- Pengiriman Material Non Ruspun Kab. Cilacap - Proses Pembangunan Kab. Purbalingga dan Cilacap

NO	KAB/KOTA	ALOKASI	POTENSI GAGAL	RUSPIN		NON RUSPIN		SELESAI
				KIRIM	BANGUN	KIRIM	BANGUN	
1	Purbalingga	10	0	10	10	10	6	6
2	Cilacap	10	0	10	10	6	0	0
Total		20	0	20	20	6	6	6



a.n. Tukin



a.n. Tuhead

PB Relokasi di Desa Gunungwuled, Kec. Rembang, Kab. Purbalingga

Pembangunan Rumah Sederhana Sehat

	JULI	AGUSTUS
Target: 100 Realisasi: 99 Progres Fisik Peny. Bansos: 98,02 % Realisasi Keuangan: Rp3.816.000.000 (95,40%)	- Penyaluran Termin 3 - Persiapan pelaksanaan kegiatan Perubahan Anggaran 2026 Catatan: Penyaluran bantuan melalui APBD murni telah selesai dilaksanakan	- Peresmian Pembangunan PB Backlog dengan Bata Interlock di Kabupaten Wonogiri - Persiapan pelaksanaan kegiatan Perubahan Anggaran 2026

NO	KAB/KOTA	ALOKASI	POTENSI GAGAL	RUSPIN		NON RUSPIN		SELESAI
				KIRIM	BANGUN	KIRIM	BANGUN	
1	Purbalingga	40	0	40	40	40	40	40
2	Sukoharjo	40	1	39	39	39	39	39
3	Wonogiri	20	0	20	20	20	20	20
Total		100	1	99	99	99	99	99

Wonogiri



Purbalingga



Sukoharjo



PROGRES PENYALURAN BANKEUPEMDES RTLH

	JULI	AGUSTUS
Target: 5.000 Realisasi: 1.503	- Identifikasi dan finalisasi usulan penanganan RTLH untuk SK Gub Tahap II - Pengajuan Konsep SK Gub RTLH Tahap II - Verifikasi RK dan BP untuk pengajuan Rekomendasi Penyaluran 2 - Laporan akhir jasa konsultansi Maintenance SIMPERUM - Laporan antara jasa konsultansi Updating SIMPERUM - Pencairan Rekom 1 (1.503 unit)	- Pengajuan Konsep SK Gub RTLH Tahap II - Pengajuan Rekomendasi Penyaluran 2

No.	KABUPATEN	KUOTA KAB		SK TAHAP I			REKOM 1		
		unit	Rupiah	desa	unit	Rupiah	desa	unit	Rupiah
1	BANJARNEGARA	140	2.800.000.000	4	17	340.000.000	4	17	340.000.000
2	BANYUMAS	275	5.500.000.000	32	124	2.480.000.000	27	111	2.220.000.000
3	BATANG	200	4.000.000.000	5	25	500.000.000	5	25	500.000.000
4	BLORA	209	4.180.000.000	15	103	2.060.000.000	15	103	2.060.000.000
5	BOYOLALI	111	2.220.000.000	11	18	360.000.000	11	18	360.000.000
6	BREBES	249	4.980.000.000	14	66	1.320.000.000	10	61	1.220.000.000
7	CILACAP	257	5.140.000.000	15	18	360.000.000	6	7	140.000.000
8	DEMAK	265	5.300.000.000	20	229	4.580.000.000	19	213	4.260.000.000
9	GROBOGAN	162	3.240.000.000	7	54	1.080.000.000	5	48	960.000.000
10	JEPARA	212	4.240.000.000	22	128	2.560.000.000	13	92	1.840.000.000
11	KARANGANYAR	80	1.600.000.000	3	3	60.000.000	3	3	60.000.000
12	KEBUMEN	117	2.340.000.000	17	31	620.000.000	17	31	620.000.000
13	KENDAL	150	3.000.000.000			-			-
14	KLATEN	107	2.140.000.000	15	45	900.000.000	14	44	880.000.000
15	KUDUS	47	940.000.000	1	1	20.000.000			-
16	MAGELANG	248	4.960.000.000	16	76	1.520.000.000	15	66	1.320.000.000
17	PATI	248	4.960.000.000	9	58	1.160.000.000	7	56	1.120.000.000
18	PEKALONGAN	159	3.180.000.000	3	22	440.000.000	3	22	440.000.000
19	PEMALANG	130	2.600.000.000	9	37	740.000.000	7	32	640.000.000
20	PURBALINGGA	199	3.980.000.000	11	47	940.000.000	11	47	940.000.000
21	PURWOREJO	115	2.300.000.000	18	49	980.000.000	18	49	980.000.000
22	REMBANG	172	3.440.000.000	9	58	1.160.000.000	6	25	500.000.000
23	SEMARANG	105	2.100.000.000	1	3	60.000.000	1	3	60.000.000
24	SRAGEN	151	3.020.000.000	11	58	1.160.000.000	11	58	1.160.000.000
25	SUKOHARJO	165	3.300.000.000	30	165	3.300.000.000	30	165	3.300.000.000
26	TEGAL	104	2.080.000.000	12	93	1.860.000.000	10	90	1.800.000.000
27	TEMANGGUNG	164	3.280.000.000	10	15	300.000.000	4	7	140.000.000
28	WONOGIRI	235	4.700.000.000	10	62	1.240.000.000	10	62	1.240.000.000
29	WONOSOBO	224	4.480.000.000	16	58	1.160.000.000	12	48	960.000.000
GRAND TOTAL		5.000	100.000.000.000	346	1.663	33.260.000.000	294	1.503	30.060.000.000

	JULI	AGUSTUS
Pekerjaan: 1. Kab. Semarang: Saluran Drainase Lingkungan 2. Kab. Kebumen: Drainase dan Jalan Lingkungan 3. Kab. Pekalongan: Jalan Lingkungan	- Kontrak Fisik Konstruksi Paket 1,2,3 - Kontrak Pengawasan paket 1,2,3 - Uitzet paket 1,2,3 - Pemeriksaan progres 55% untuk termin 1 pada pekerjaan konstruksi paket 3 di kab Pekalongan	- Pelaksanaan pekerjaan dan supervisi 3 paket pekerjaan



Pelaksanaan Uitzet

Selanjutnya...

Pekerjaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

(Berupa Perbaikan dan Pembangunan Konstruksi Prasarana dan Sarana) TA. 2026

PAKET 1:
KAB. SEMARANG

Status: 2 Agustus 2026

Data Umum

Jenis Pekerjaan:

Pekerjaan Drainase Lingkungan

Alamat:

Desa Pasekan, Kec. Ambarawa,
Kab. Semarang

Penyedia:

CV. Wiri Darojati

Awal Kontrak:

2 Juli 2026

Nilai Kontrak:

Rp392.324.132,00

Akhir Kontrak:

29 September 2026

Masa Kontrak:

90 Hari

Progres Pekerjaan

Progres Kumulatif:

34,29%

Progres Rencana:

34,18%

Deviasi:

0,11% (Positif)

Pekerjaan Saat Ini

- Galian tanah
- Pemasangan pondasi batu belah

Pekerjaan Selanjutnya

- Pembesian
- Acian & plesteran

Dokumentasi Progres Pekerjaan



Pekerjaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

(Berupa Perbaikan dan Pembangunan Konstruksi Prasarana dan Sarana) TA. 2026

PAKET 2:
KAB. KEBUMEN

Status: 2 Agustus 2026

Data Umum

Jenis Pekerjaan:

Pekerjaan Drainase & Jalan
Lingkungan

Alamat:

Desa Prembun, Kec. Prembun,
Kab. Kebumen

Penyedia:

CV. Syauqi Jaya

Tanggal Kontrak:

3 Juli 2026

Nilai Kontrak:

Rp396.701.743,00

Akhir Kontrak:

30 September 2026

Masa Kontrak:

90 Hari

Progres Pekerjaan

Progres Kumulatif:

17,47%

Progres Rencana:

16,48%

Deviasi:

0,99% (Positif)

Pekerjaan Saat Ini

- Galian tanah
- Pekerjaan lantai kerja
- Pemasangan bekisting

Pekerjaan Selanjutnya

- Penulangan besi
- Pengecoran jalan

Dokumentasi Progres Pekerjaan



Pekerjaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

(Berupa Perbaikan dan Pembangunan Konstruksi Prasarana dan Sarana) TA. 2026

PAKET 3:
KAB. PEKALONGAN

Status: 2 Agustus 2026

Data Umum

Jenis Pekerjaan:

Pekerjaan Drainase & Jalan Lingkungan

Alamat:

Desa Tegalontar, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan

Penyedia:

CV. Mutiara Azka

Tanggal Kontrak:

6 Juli 2026

Nilai Kontrak:

Rp396.571.039,00

Akhir Kontrak:

3 September 2026

Masa Kontrak:

60 Hari

Progres Pekerjaan

Progres Kumulatif:

79,69%

Progres Rencana:

40,70%

Deviasi:

38,99% (Positif)



Pekerjaan Saat Ini

- Pengecoran jalan
- *Grooving* beton
- Pengecoran drainase

Pekerjaan Selanjutnya

- Pekerjaan jalan aspal
- Batu prasasti

Dokumentasi Progres Pekerjaan

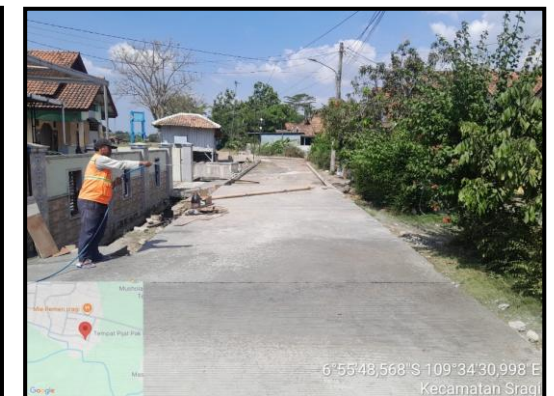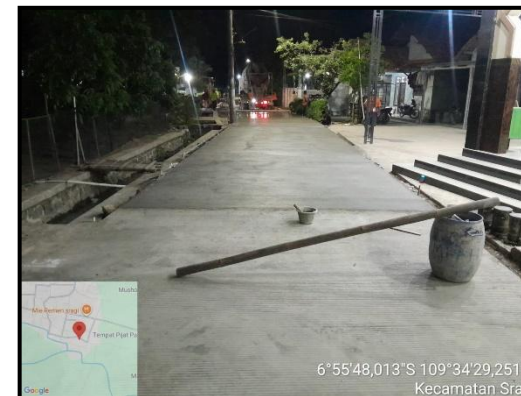

Kab. Demak

Penyediaan Prasarana Permukiman di Ds. Timbulsloko

Paket 1: Jalan Panggung dan MCK Komunal

Paket 2: Talud Jalan

JULI

- Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Penyediaan Prasarana Permukiman Paket 1 dan Paket 2
- Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana Permukiman Paket 1 dan Paket 2

AGUSTUS

- Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Penyediaan Prasarana Permukiman Paket 1 dan Paket 2
- Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana Permukiman Paket 1 dan Paket 2



Pemeriksaan Progres 50% Pekerjaan Konstruksi Penyediaan Prasarana Permukiman (Paket 1)



Monitoring Progres Pekerjaan Penyediaan Prasarana Permukiman (Paket 1 dan 2)

RAPAT CCO (Contract Change Order)
PEKERJAAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN (PAKET 1)

JULI	AGUSTUS
- Penyerahan dan pembayaran patok bidang tanah sertifikasi Penerima Bantuan Perumahan di Kab. Purbalingga dan Brebes - Penyerahan dan pembayaran patok bidang tanah sertifikasi LP2B dan Penerima Bantuan Perumahan di Kab. Cilacap - Pembayaran Honor Tim Pendamping Sertifikasi - Pengukuran bidang tanah penerima sertifikasi LP2B dan bantuan perumahan Permasalahan: Perubahan Daftar Penerima Bantuan Sertifikasi Penerima Bantuan Perumahan karena adanya bidang tanah yang telah bersertifikat di Kab. Purbalingga dan Kab. Cilacap Upaya: Sedang dalam proses validasi dan verifikasi data oleh Kantah BPN Bersama Pemkab. Surat perubahan data penerima bantuan disampaikan oleh Pemkab selambat-lambatnya awal Agustus.	- Rapat Koordinasi progres pelaksanaan sertifikasi L2PB dan Sertifikasi Penerima Bantuan Perumahan - Pengukuran bidang tanah penerima sertifikasi LP2B dan bantuan perumahan - Pembayaran patok bagi penerima bantuan sertifikasi bantuan perumahan di Kabupaten Brebes




Penyerahan Patok Kegiatan Sertifikasi Penerima Bantuan Perumahan di Kab. Brebes




LaporGub!


KANAN ADUAN




KONTEN MEDIA SOSIAL





FOLLOWER / SUBSCRIBER AKUMULATIF



KONTEN BERITA WEB DINAS

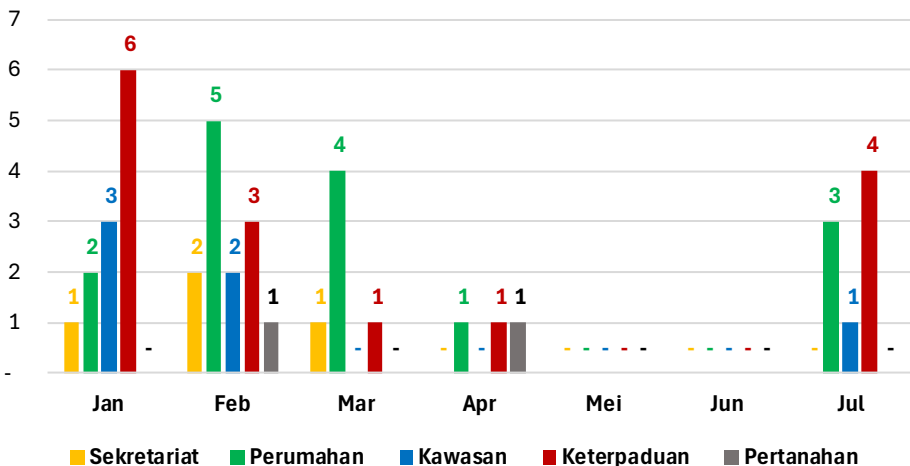

SURVEY KEPUASAN WEBSITE



STATISTIK PENGUNJUNG WEBSITE	
BULAN JUNI	515
AKUMULATIF	356.520



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng

TERIMA KASIH



(024) 7600247



Jl. Madukoro
Blok AA-BB Komplek
PRPP Semarang



www.disperakim.jatengprov.go.id

