


CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA S.D. OKTOBER

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (Rp 24.128.017.000)

Catatan:
 ✓ Jenis IK Program **Proges Positif**
 ✓ Realisasi Mulai JANUARI memperhitungkan Realisasi Kinerja Tahun 2024

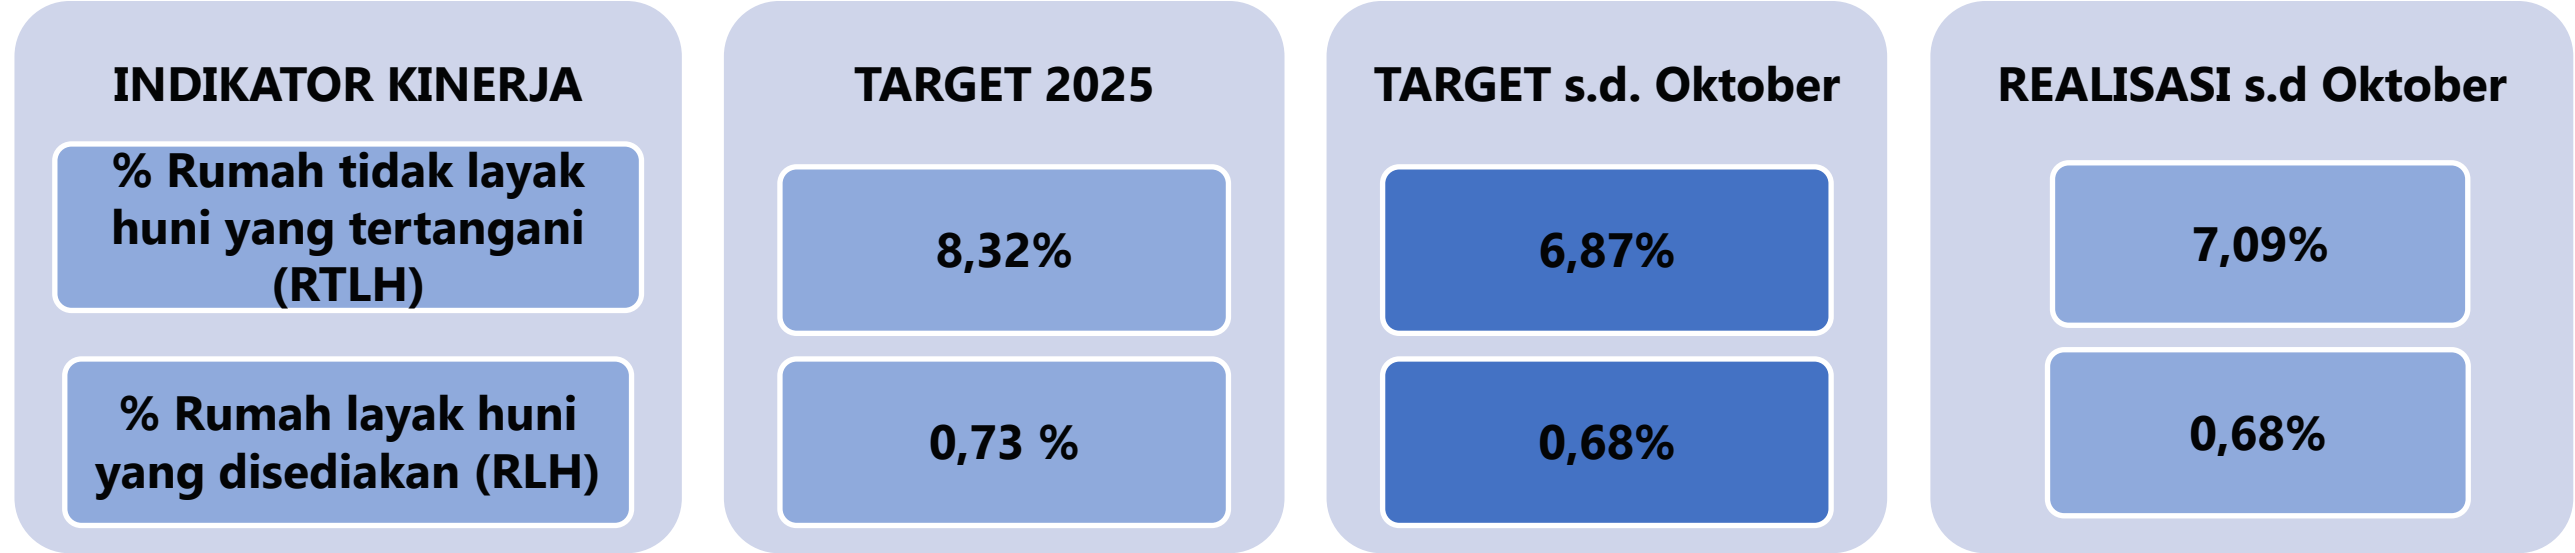

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PA 2025	REALISASI S.D. Oktober	RINCIAN	AKTIVITAS BULAN OKTOBER
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	2 dokumen	0 dokumen	(Target di TW IV)	
	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi	2 dokumen	0 dokumen	(Target di TW IV)	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 dokumen	0 dokumen		- rapat koordinasi rumah terdampak bencana kab. kendal - penyusunan dokumen output
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	2 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen "Identifikasi Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Terkena Relokasi Program Pemerintah" (sudah asmanan, belum dijilid)	-Verifikasi mandiri rumah korban bencana -Verifikasi mandiri rumah sederhana sehat -Verifikasi mandiri rumah terdampak relokasi program pemerintah

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PA 2025	REALISASI S.D. Oktober	RINCIAN
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	1 dokumen	0 dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - (Target di TW IV) - Draft sudah naik asmanan
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi	1 dokumen	0 dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - (Target di TW IV) - Draft sudah naik asmanan
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	200 orang	204 orang	<ul style="list-style-type: none"> - penyusunan dokumen output - Target telah terpenuhi di TW 2
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	300 orang	301 orang	<ul style="list-style-type: none"> - penyusunan dokumen output, - koordinasi pembiayaan mikro dengan kementerian pkp dan perbankan di Kab. Sukoharjo



KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PA 2025	TARGET S.D. OKTOBER	REALISASI S.D. OKTOBE	RINCIAN	AKTIVITAS BULAN OKTOBER
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	170 unit	121 unit	115 unit		
	Jumlah Unit Pembangunan Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi	340 unit	242 unit	250 unit		
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	150 unit	108 unit	100 unit	Kab. Demak= 63 unit Kab. Wonosobo= 10 unit Kab. Grobogan= 5 unit Kab. Pemalang= 10 unit	- Desk RAB di Kab. Demak, Kendal, Grobogan, Kota Pekalongan
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	20 unit	13 unit	15 unit	Kab. Demak= 12 unit, Kota Pekalongan= 3 unit	- Pelatihan Perakitan RUSPIN Kab. Demak dan Kendal - Pengiriman RUSPIN Kab. Demak dan Kendal
	Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	240 unit	181 unit	202 unit	Kab. Banyumas= 37 unit, Kab. Batang= 24 unit, Kab. Boyolali= 36 unit, Kab. Kendal= 30 unit, Kab. Sukoharjo= 19 unit, Kab. Wonogiri= 39 unit, Kota Tegal= 17 unit	- Pendampingan pengadaan ruspin (workshop) KDL, WNG, SKH, Kota PKL, Kota & Kab SMG - pelatihan perakitan ruspin (demo) KDL, WNG, SKH




KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PA 2025	TARGET S.D. OKTOBER	REALISASI S.D. OKT	RINCIAN	AKTIVITAS BULAN OKTOBER
	Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	100 unit	61 unit	48 unit	Kab. Banjarnegara= 18 unit, Kab. Banyumas= 2 unit, Kota Tegal= 2 unit, Kota Salatiga= 3 unit	- Workshop RUSPIN kpd Pokmas Kab. Purworejo, Banjarnegara, Sukoharjo, Kendal, Batang, Blora, Kota Surakarta, Pekalongan, Tegal - Pelatihan Perakitan RUSPIN Kab. Purworejo, Banjarnegara, Sukoharjo, Kendal, Batang, Kota Pekalongan, Tegal - Pengiriman RUSPIN Kab. Purworejo, Banjarnegara, Sukoharjo, Kendal, Batang, Kota Pekalongan, Tegal
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	17.000 unit	11.000 unit	11.940 unit	Rekom 5: 803 Rekom 4: 1343 unit	
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 laporan	0 laporan	0 laporan		- Penetapan SK Tahap 4/ Perubahan - Desk percepatan Bankeupemdes SK Tahap 4 - Pengajuan rekom 5



PROGRES BANKEUPEMDES RTLH


PENGAJUAN REKOM S.D. AKHIR OKTOBER

No.	KABUPATEN	KUOTA KAB	TOTAL SK	REKOM 1	REKOM 2	REKOM 3	REKOM 4	REKOM 5	TOTAL	
		unit	unit	unit	unit	unit	unit	Unit	unit	Rupiah
1	BANJARNEGARA	791	251	15	0	113	33	18	179	3.220.000.000
2	BANYUMAS	831	831	129	3	451	157	75	815	14.800.000.000
3	BATANG	698	698	133	13	481	6	36	669	12.660.000.000
4	BLORA	614	614	160	262	159	18	-	599	11.980.000.000
5	BOYOLALI	322	322	51	81	175	0	-	307	6.140.000.000
6	BREBES	511	511	23	114	30	39	3	209	4.120.000.000
7	CILACAP	661	661	154	0	350	62	-	566	11.320.000.000
8	DEMAK	641	641	91	132	282	114	7	626	12.380.000.000
9	GROBOGAN	1.089	339	33	13	167	112	12	337	6.500.000.000
10	JEPARA	320	320	52	0	104	127	5	288	5.660.000.000
11	KARANGANYAR	632	357	39	0	35	3	164	241	1.540.000.000
12	KEBUMEN	597	347	42	0	100	90	-	232	4.640.000.000
13	KENDAL	535	535	63	36	83	244	92	518	8.520.000.000
14	KLATEN	485	310	20	2	226	0	-	248	4.960.000.000
15	KUDUS	182	182	11	0	82	1	-	94	1.880.000.000
16	MAGELANG	618	618	119	153	285	0	-	557	11.140.000.000
17	PATI	546	546	239	96	144	0	-	479	9.580.000.000
18	PEKALONGAN	506	506	115	30	161	17	3	326	6.460.000.000
19	PEMALANG	509	459	95	81	172	26	25	399	7.480.000.000
20	PURBALINGGA	774	579	117	0	162	177	105	561	9.120.000.000
21	PURWOREJO	645	345	64	0	112	0	152	328	3.520.000.000
22	REMBANG	509	509	30	75	189	116	17	427	8.200.000.000
23	SEMARANG	371	371	30	10	60	128	89	317	4.560.000.000
24	SRAGEN	650	350	69	50	99	131	-	349	6.980.000.000
25	SUKOHARJO	473	473	30	28	2	407	-	467	9.340.000.000
26	TEGAL	567	367	20	3	172	0	-	195	3.900.000.000
27	TEMANGGUNG	584	584	30	0	256	118	-	404	8.080.000.000
28	WONOGIRI	781	781	40	148	127	427	-	742	14.840.000.000
29	WONOSOBO	558	558	123	50	223	65	-	461	9.220.000.000
GRAND TOTAL		17.000	13.965	2.137	1.380	5002	2.618	803	11.940	222.740.000.000

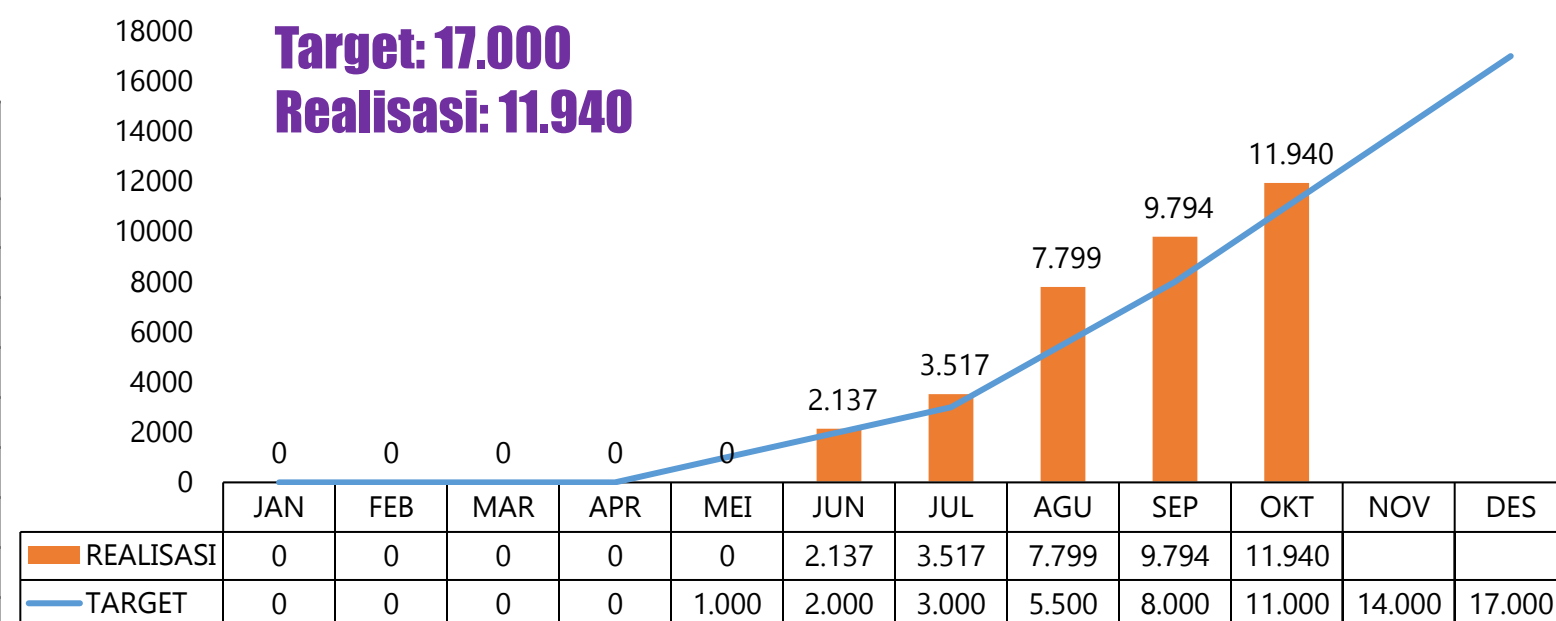

Status pencairan s.d. 31 Oktober senilai Rp 238.800.000.000

PROGRES BANSOS PK BENCANA

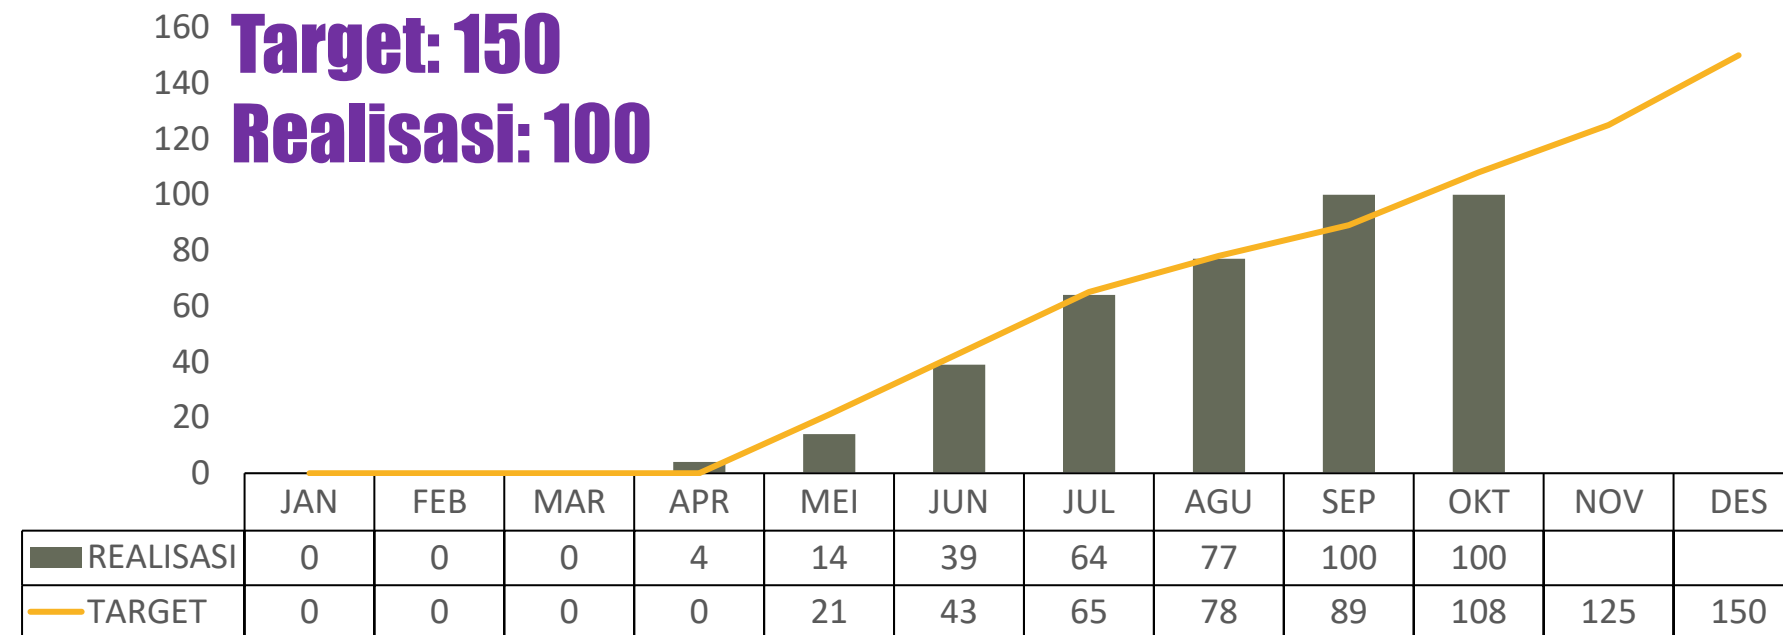

Aktivitas Bulan Ini:

- ✓ Desk RAB di Kab. Demak, Kendal, Grobogan, Kota Pekalongan

Kendala:

Upaya Penyelesaian:

Rencana Kegiatan Bulan berikutnya :

- ✓ monitoring pelaksanaan kegiatan di Kota Pekalongan, Kab. Grobogan, Kendal, Demak
- ✓ Pembayaran termin 1: Kota Pekalongan, Kab. Grobogan, Kendal, Demak


NO	KABUPATEN/ KOTA	ALOKASI MURNI	MATERIAL		SELESAI
			KIRIM	BANGUN	
1	Demak	105	75	63	63
2	Wonosobo	10	10	10	10
3	Grobogan	15	5	5	5
4	Kota Pekalongan	5	0	0	0
5	Pemalang	10	10	10	10
6	Kendal	5	0	0	0
Total		150	100	88	88

Realisasi Fisik : 66,67 %

Realisasi Keuangan: Rp 2.000.000.000



PROGRES BANSOS PB BACKLOG

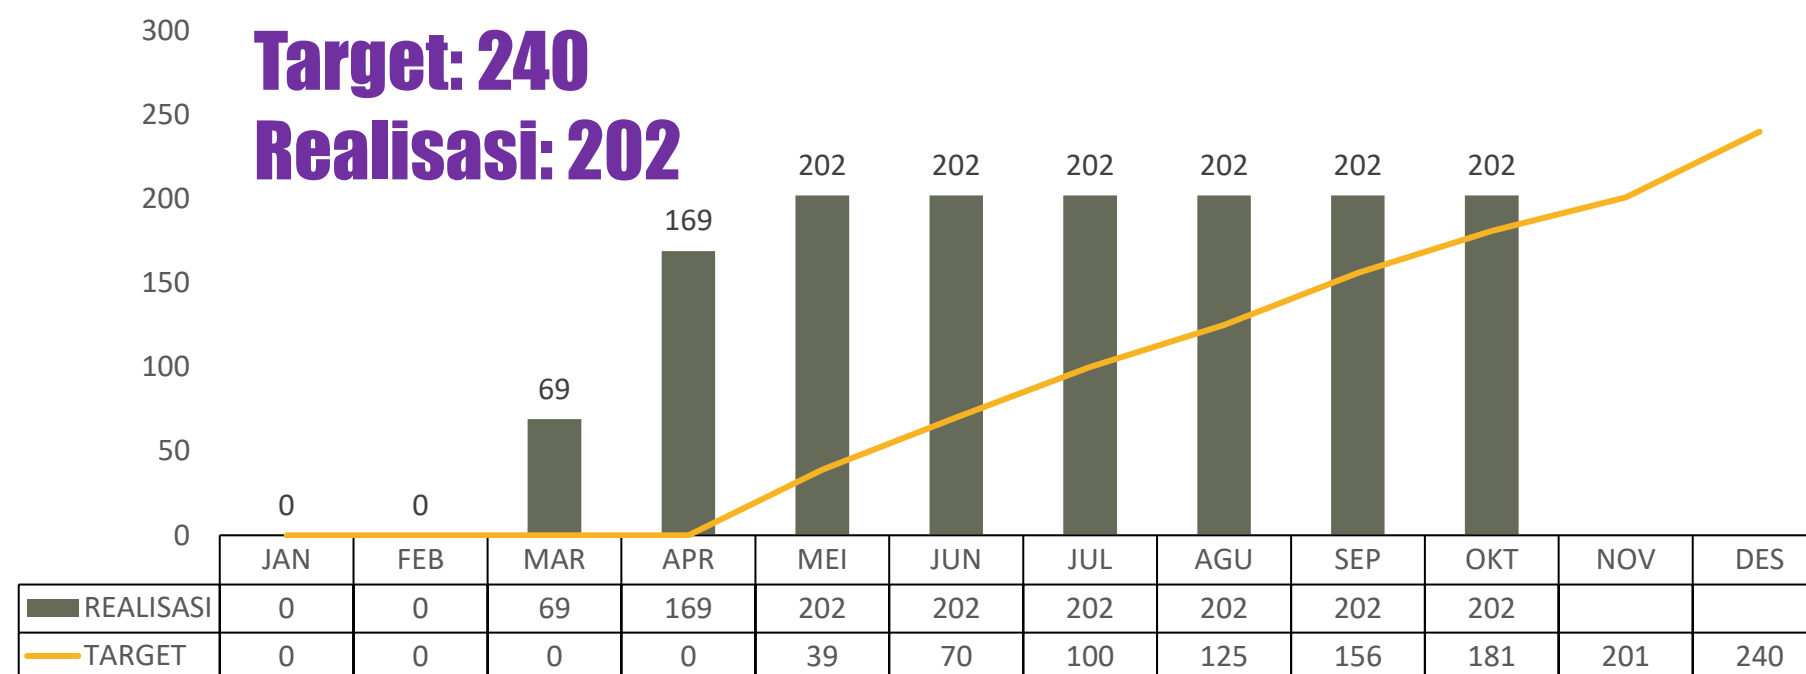

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI MURNI	PONDASI	RUSPIN		NON RUSPIN		SELESAI
				KIRIM	BANGUN	KIRIM	BANGUN	
1	Banyumas	37	37	37	37	37	37	37
2	Batang	24	24	24	24	24	24	24
3	Boyolali	36	36	36	36	36	36	36
4	Kendal	36	30	30	30	30	30	30
5	Sukoharjo	37	19	19	19	19	19	19
6	Wonogiri	46	39	39	39	39	39	39
7	Semarang	2	0	0	0	0	0	0
8	Kota Tegal	17	17	17	17	17	17	17
9	Kota Semarang	3	0	0	0	0	0	0
10	Kota Pekalongan	2	0	0	0	0	0	0
Total		240	202	202	202	202	202	202

Aktivitas Bulan Ini:

- ✓ Pendampingan pengadaan ruspin (workshop) KDL, WNG, SKH, Kota PKL, Kota & Kab SMG
- ✓ Pelatihan perakitan ruspin (demo) KDL, WNG, SKH

Kendala:

-

Upaya Penyelesaian:


-

Rencana Kegiatan Bulan berikutnya :

- ✓ Pendampingan percepatan penyaluran termin

Realisasi Fisik : 91,30%


Realisasi Keuangan: Rp 8.080.000.000



PROGRES BANSOS PB BENCANA



Target: 20
Realisasi: 15

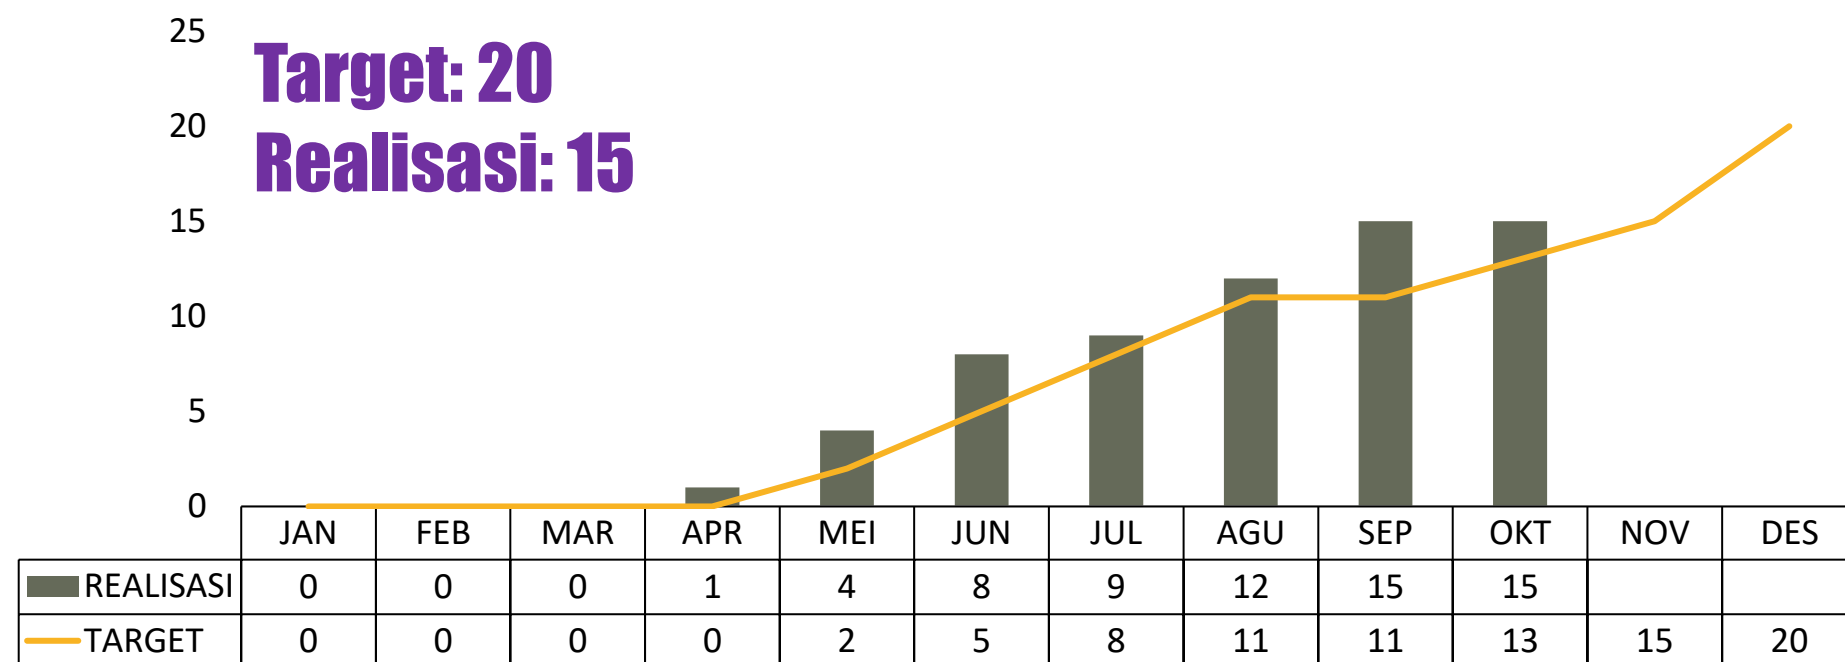

Aktivitas Bulan Ini:

- ✓ Pelatihan Perakitan RUSPIN Kab. Demak dan Kendal
- ✓ Pengiriman RUSPIN Kab. Demak dan Kendal

Kendala:

-

Upaya Penyelesaian:

-

Rencana Kegiatan Bulan Depan:

- ✓ Monitoring pelaksanaan pembangunan di Kab. Demak dan Kendal
- ✓ Pembayaran termin 1 Kab. Demak dan Kendal

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	RUSPIN		NON RUSPIN		SELESAI
			KIRIM	BANGUN	KIRIM	BANGUN	
1	Demak	15	15	15	12	12	12
2	Kota Pekalongan	3	3	3	3	3	3
3	Kendal	2	0	0	0	0	0
Total		20	18	18	15	15	15


Realisasi Fisik : 75,00%

Realisasi Keuangan: Rp750.000.000



PROGRES BANSOS PB RELOKASI

Target: 100
Realisasi: 48

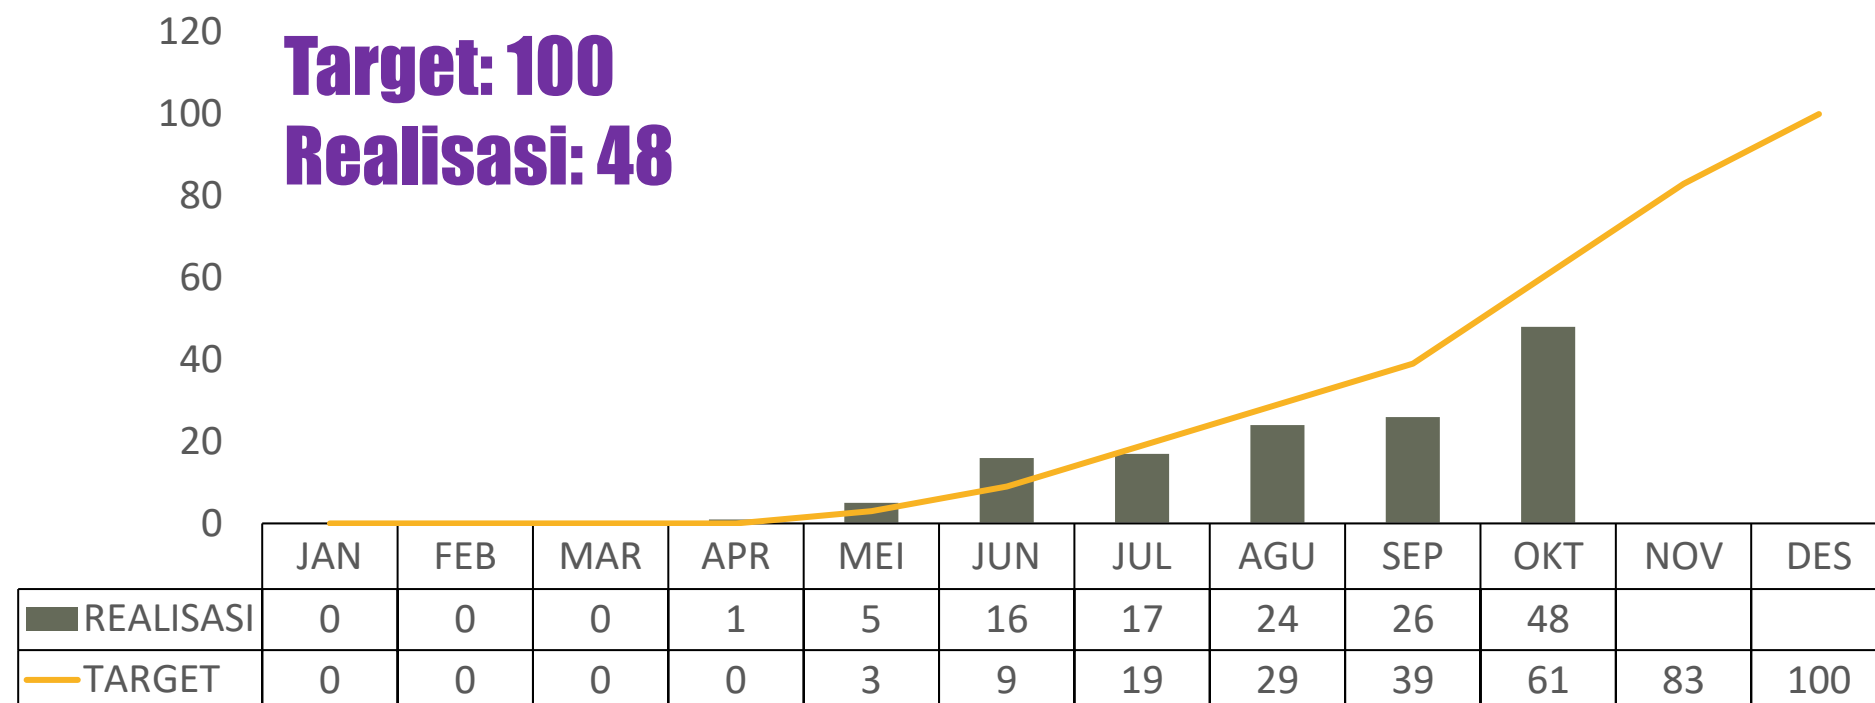

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	RUSPIN		NON RUSPIN		SELESAI
			KIRIM	BANGUN	KIRIM	BANGUN	
1	Banjarnegara	53	53	48	36	36	36
2	Kota Tegal	9	7	7	2	2	2
3	Kota Salatiga	4	4	4	4	4	4
4	Banyumas	2	2	2	2	2	2
5	Kota Semarang	2	2	2	1	0	0
6	Purworejo	6	6	6	0	0	0
7	Kendal	3	2	2	0	0	0
8	Kota Surakarta	2	0	0	0	0	0
9	Jepara	5	5	4	0	0	0
10	Sukoharjo	3	3	1	0	0	0
11	Kota Pekalongan	4	3	1	0	0	0
12	Batang	2	2	2	2	0	0
13	Blora	5	0	0	0	0	0
Total		100	89	79	51	48	48

Aktivitas Bulan Ini:

- ✓ Workshop RUSPIN kpd Pokmas Kab. Purworejo, Banjarnegara, Sukoharjo, Kendal, Batang, Blora, Kota Surakarta, Pekalongan, Tegal
- ✓ Pelatihan Perakitan RUSPIN Kab. Purworejo, Banjarnegara, Sukoharjo, Kendal, Batang, Kota Pekalongan, Tegal
- ✓ Pengiriman RUSPIN Kab. Purworejo, Banjarnegara, Sukoharjo, Kendal, Batang, Kota Pekalongan, Tegal

Kendala:

Upaya Penyelesaian:

Rencana Kegiatan Bulan Depan:

- ✓ Pelatihan perakitan di Kab. Blora dan Kota Surakarta
- ✓ Monitoring pengiriman Kab. Banjarnegara, Purworejo, Batang
- ✓ Pembayaran termin 1: Banjarnegara, Purworejo, Batang, Kendal, Sukoharjo, Blora, Kota Tegal, Pekalongan, Surakarta

Realisasi Fisik : 49,63 %

Realisasi Keuangan: Rp 1.796.000.000
