



RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR JANUARI 2022




**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

OUTLINE

1. Komposisi Anggaran TA 2022
2. Pelaporan Progres Pelaksanaan APBD Status Akhir Januari TA 2022
3. Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
5. Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN APBD

NO	BIDANG - SEKRETARIAT	PAGU ANGGARAN 2022
1	Sekretariat	17.439.693.000
2	Perumahan	21.025.000.000
3	Kawasan Permukiman	3.910.000.000
4	Pertanahan	1.550.000.000
5	Keterpaduan Pkp	1.500.000.000
TOTAL DINAS		45.424.693.000

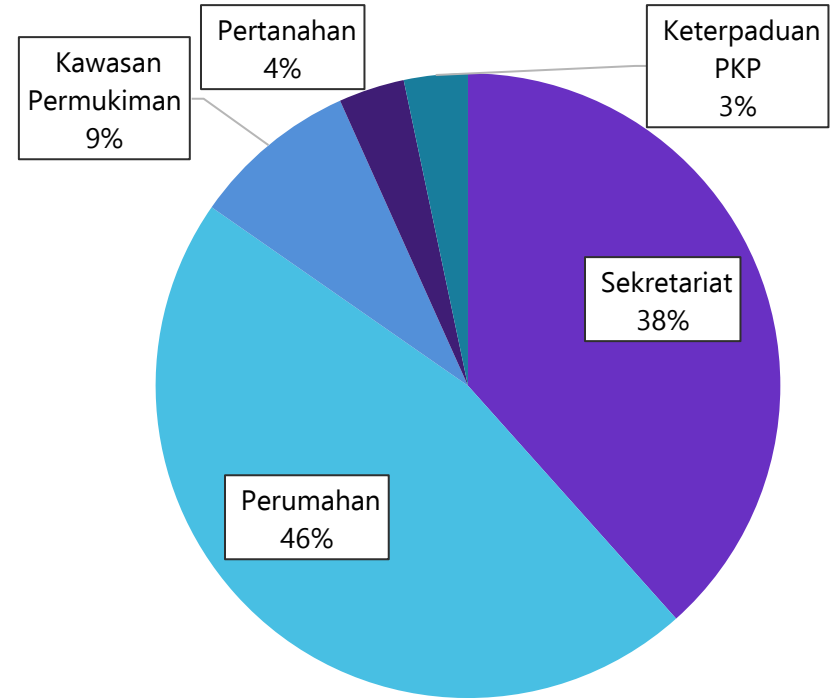




Realisasi Anggaran APBD *)

Status Akhir Januari 2022

*)Realiasi keuangan diambil dari e-controlling Status 3 Feb 2022


Disperakim

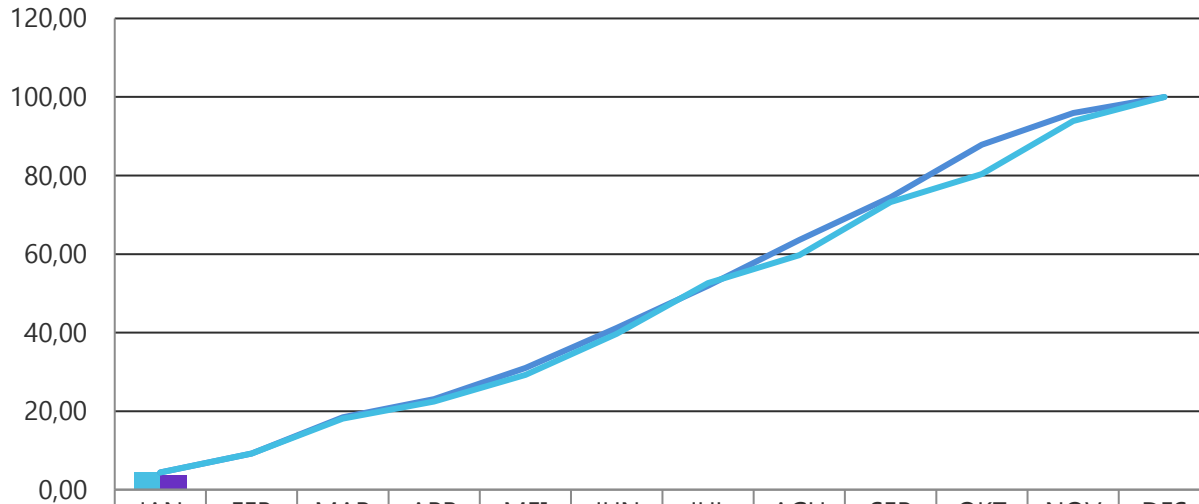

R.FISIK	4,44											
R.KEU	3,60											
T.FISIK	4,37	9,23	18,45	23,08	31,01	41,18	51,95	63,62	74,45	87,83	95,90	100,00
T.KEU	4,37	9,20	18,12	22,46	29,25	39,73	52,60	59,73	73,22	80,37	93,89	100,00

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	4,37	9,23
Target Keu	4,37	9,20
Real. Fisik	4,44	12,08
Real. Keu	3,60	11,91
Dev. Fisik	0,07	2,85
Dev. Keu	-0,77	2,74


Sekretariat

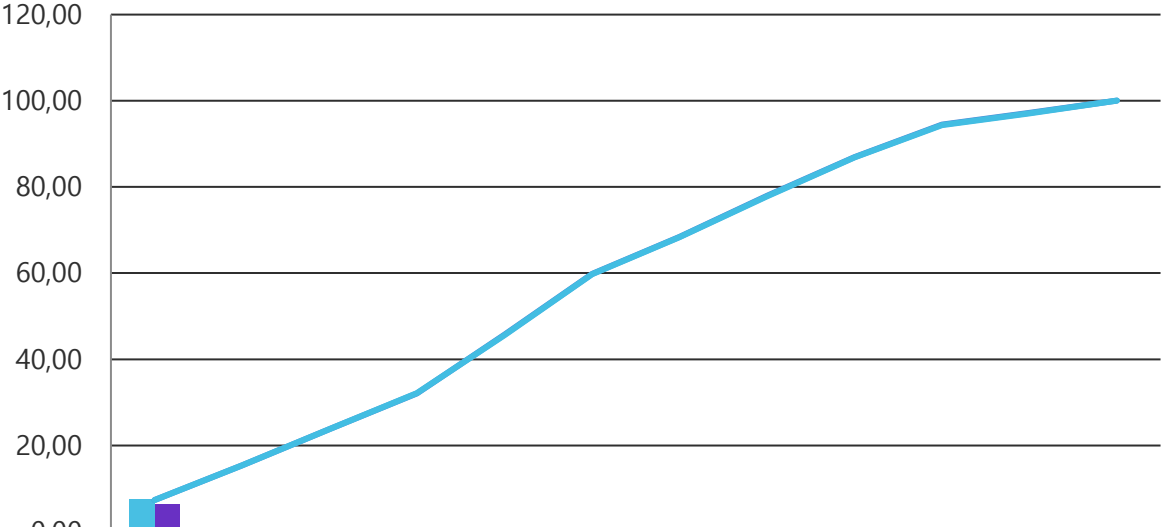

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	7,54											
R.KEU	6,43											
T.FISIK	7,36	15,37	23,78	32,11	45,67	59,81	68,40	77,91	86,93	94,42	97,20	100,0
T.KEU	7,36	15,36	23,77	32,12	45,60	59,75	68,32	77,82	86,85	94,34	97,08	100,0

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	7,36	15,37
Target Keu	7,36	15,36
Real. Fisik	7,54	15,52
Real. Keu	6,43	15,49
Dev. Fisik	0,18	0,15
Dev. Keu	-0,93	0,13


Bidang Perumahan

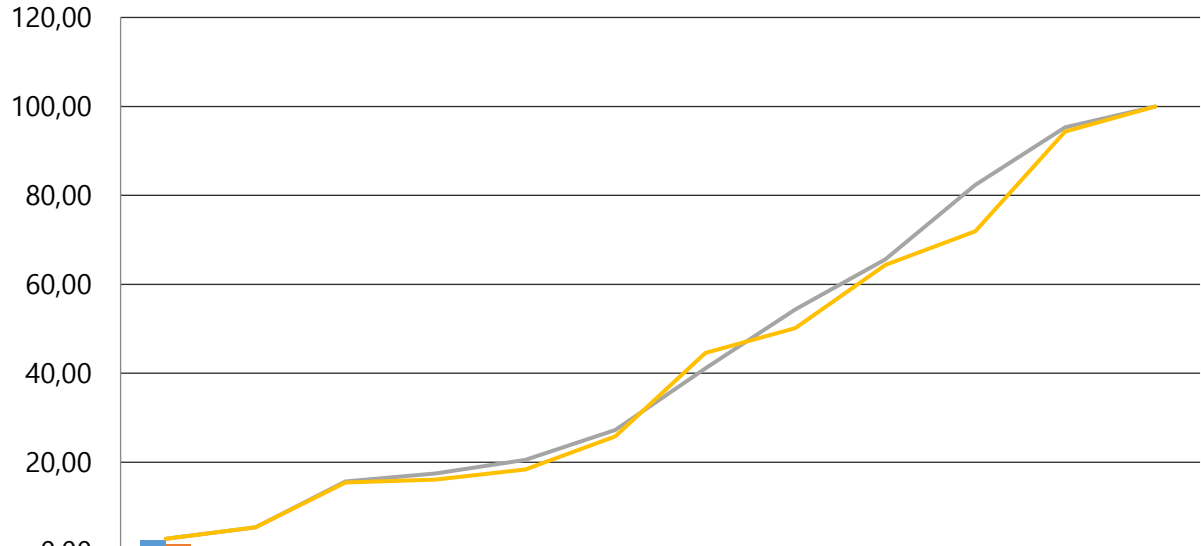

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	2,37											
R.KEU	1,58											
T.FISIK	2,80	5,38	15,69	17,46	20,53	27,24	41,08	54,33	65,65	82,34	95,29	100,00
T.KEU	2,80	5,34	15,41	16,09	18,36	25,84	44,55	50,16	64,35	71,90	94,32	100,00

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	2,80	5,38
Target Keu	2,80	5,34
Real. Fisik	2,37	10,84
Real. Keu	1,58	10,50
Dev. Fisik	-0,43	5,46
Dev. Keu	-1,22	5,17


Bidang Kawasan Permukiman

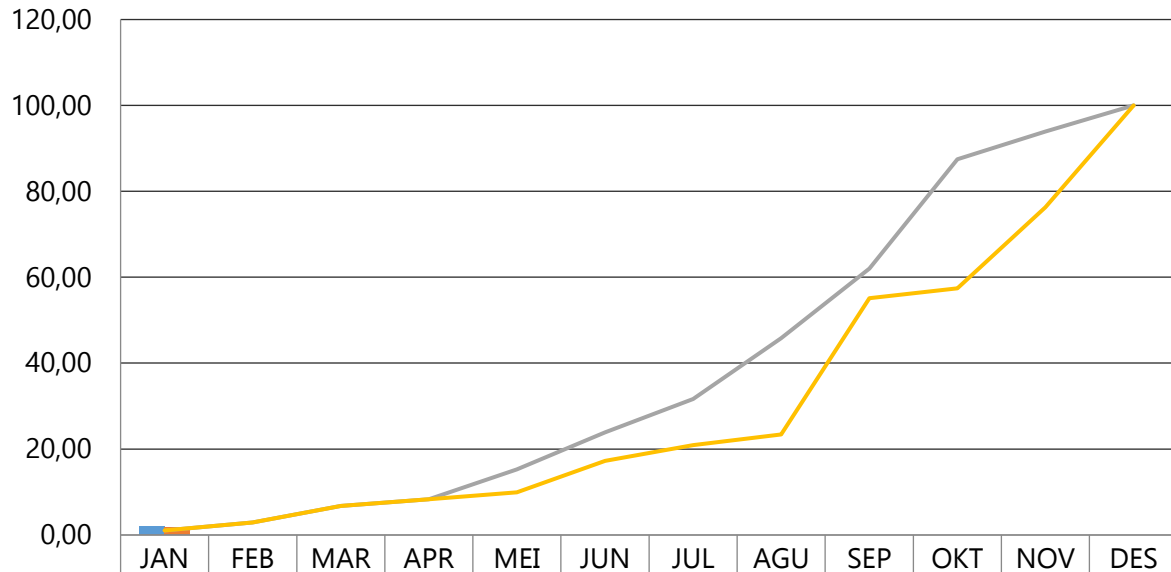

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	2,02											
R.KEU	1,81											
T.FISIK	1,02	2,91	6,76	8,32	15,27	23,87	31,65	45,78	62,01	87,49	93,91	100,0
T.KEU	1,02	2,91	6,76	8,32	9,90	17,22	20,91	23,40	55,11	57,44	76,26	100,0

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	1,02	2,91
Target Keu	1,02	2,91
Real. Fisik	2,02	5,51
Real. Keu	1,81	5,51
Dev. Fisik	1,00	2,60
Dev. Keu	0,79	2,60

Bidang Pertanahan

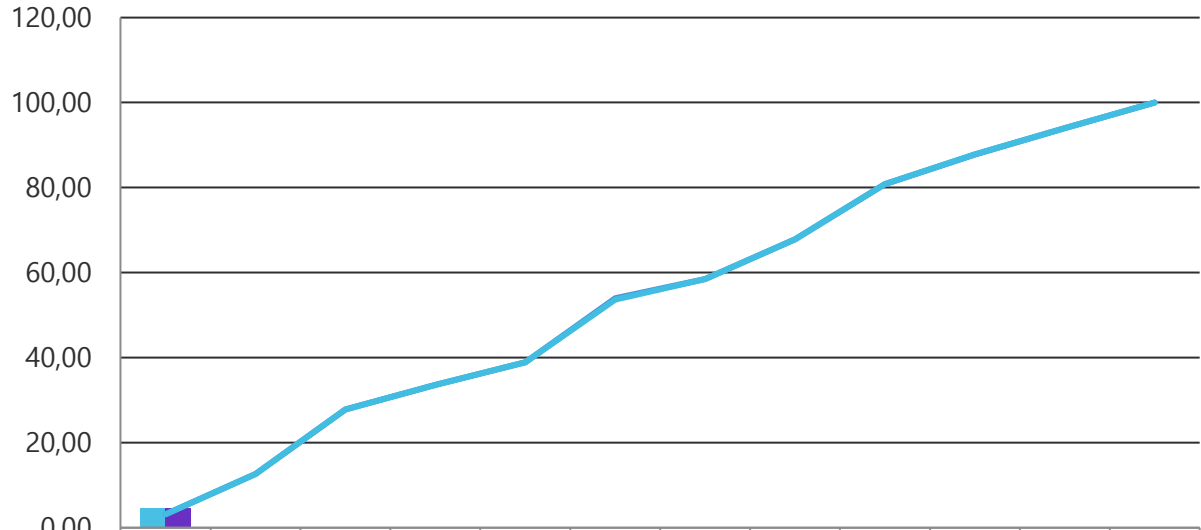


	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	4,52											
R.KEU	4,50											
T.FISIK	3,14	12,59	27,82	33,53	38,90	53,94	58,44	67,79	80,80	87,79	93,99	100,00
T.KEU	3,14	12,60	27,82	33,54	38,90	53,64	58,45	67,79	80,80	87,80	94,00	100,00

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	3,14	12,59
Target Keu	3,14	12,60
Real. Fisik	4,52	13,12
Real. Keu	4,50 ^{*)}	13,12
Dev. Fisik	1,38	0,52
Dev. Keu	1,36	0,52

^{*)} Angka dari data yang dikirimkan bidang, karena s.d. status 5 Feb 2022 realisasi keuangan Bid. Pertanahan belum masuk ke system e-controlling

Bidang Keterpaduan PKP

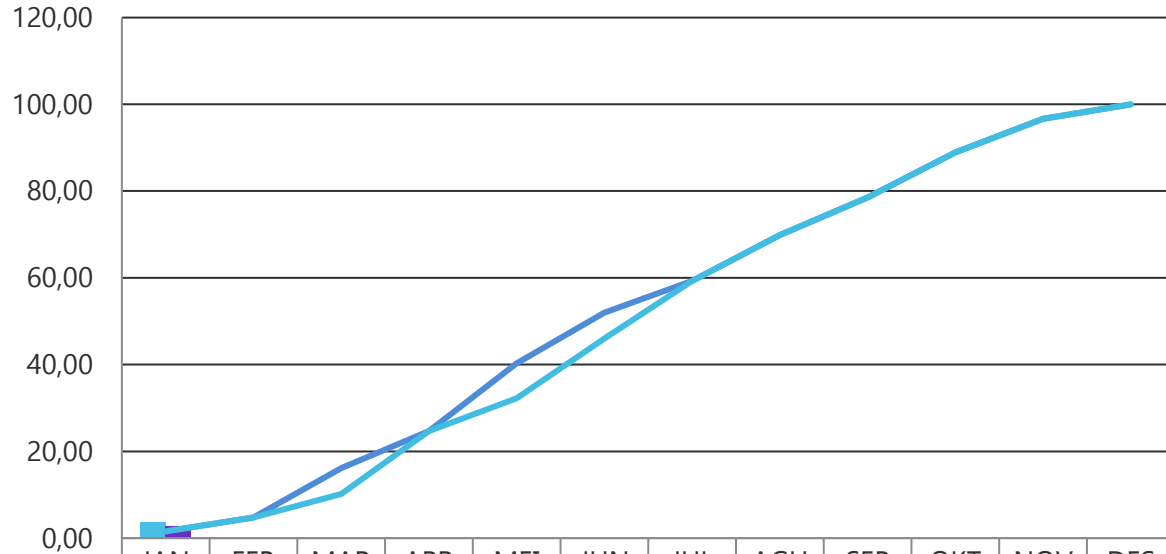

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,61											
R.KEU	2,79											
T.FISIK	1,56	4,75	16,14	24,66	40,26	51,98	59,26	69,85	78,50	88,93	96,64	100,0
T.KEU	1,56	4,75	10,14	24,65	32,26	45,98	59,26	69,85	78,50	88,92	96,64	100,0

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	1,56	4,75
Target Keu	1,56	4,75
Real. Fisik	3,61	5,44
Real. Keu	2,79	5,44
Dev. Fisik	2,05	0,69
Dev. Keu	1,23	0,69



PELAPORAN PROGRES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Status Akhir Januari 2022

Bidang Perumahan

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES SELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verifikasi Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banjarnegara	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
2		Pendataan dan Verifikasi Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banyumas	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
3		Pendataan dan Verifikasi Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
4		Pendataan dan Verifikasi Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Boyolali	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
5		Pendataan dan Verifikasi Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Brebes	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	
6		Pendataan dan Verifikasi Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Demak	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	
7		Pendataan dan Verifikasi Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Karanganyar	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	
8		Pendataan dan Verifikasi Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kebumen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	
9		Pendataan dan Verifikasi Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
10		Pendataan dan Verifikasi Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Klaten	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	

Bidang Perumahan (lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
11	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
12		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pati	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
13		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pekalongan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
14		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pemalang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	
15		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Purbalingga	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
16		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Rembang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
17		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Sragen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	
18		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	
19		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Wonosobo	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)

Bidang Perumahan (lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Tumanggal Kabupaten Purbalingga	120.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	Pengajuan SK Penerima Bantuan	Februari - Juni
2		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Jeruksari Kabupaten Pekalongan	144.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	Pengajuan SK Penerima Bantuan	Februari - Juni
3		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bongas Kabupaten Pemalang	48.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	Pengajuan SK Penerima Bantuan	Februari - Juni
4		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Sriwulan Kabupaten Demak	144.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	Pengajuan SK Penerima Bantuan	Februari - Juni
5		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Blerong Kabupaten Demak	72.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	Pengajuan SK Penerima Bantuan	Februari - Juni
6		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bedono Kabupaten Demak	84.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	Pengajuan SK Penerima Bantuan	Februari - Juni
7	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga	200.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (1 orang penerima bantuan mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
8		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Kebumen	250.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
9		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purworejo	150.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
10		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Boyolali	200.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22

Bidang Perumahan (lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	1.000.000.000	Tender		Oktober - Desember
2		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	60.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
3		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	60.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
4		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	80.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
5		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
6		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
7		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
8		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
9		Jasa Konsultansi UKL/UPL di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
10		Jasa Konsultansi UKL/UPL di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
11		Jasa Konsultansi UKL/UPL di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
12		Jasa Konsultansi UKL/UPL di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
13		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Pekalongan	1.015.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22

Bidang Perumahan (lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
14		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Wonogiri	945.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
15		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Tegal	210.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22

Bidang Kawasan Permukiman

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 (LIMA BELAS) HA						
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	50.000.000	Pengadaan Langsung		April
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 1)	500.000.000	Tender		Juli
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 2)	400.000.000	Tender		Juli
4		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 3)	250.000.000	Tender		Juli
5		Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	Seleksi		Mei
6		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	Seleksi		Mei
7		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	Seleksi		Mei
8		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung		April
9		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung		April
10		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 1)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
11		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 2)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli

Bidang Kawasan Permukiman

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
12		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 3)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
13		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
14		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung		Juli

Bidang Keterpaduan PKP


NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH						
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi dan Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK	Maret
2		Konsultan Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	100.000.000	Tender	Penyusunan KAK	Maret
3		Konsultan Penyusunan Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Tender	Penyusunan KAK	Maret
4		Konsultan Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Tender	Penyusunan KAK	Maret
5		Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan	100.000.000	Seleksi		April
6		Konsultan Individual Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	42.000.000	Seleksi		Maret



PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

Status Akhir Januari 2022

Laporan Hasil Survey Kepuasan Website

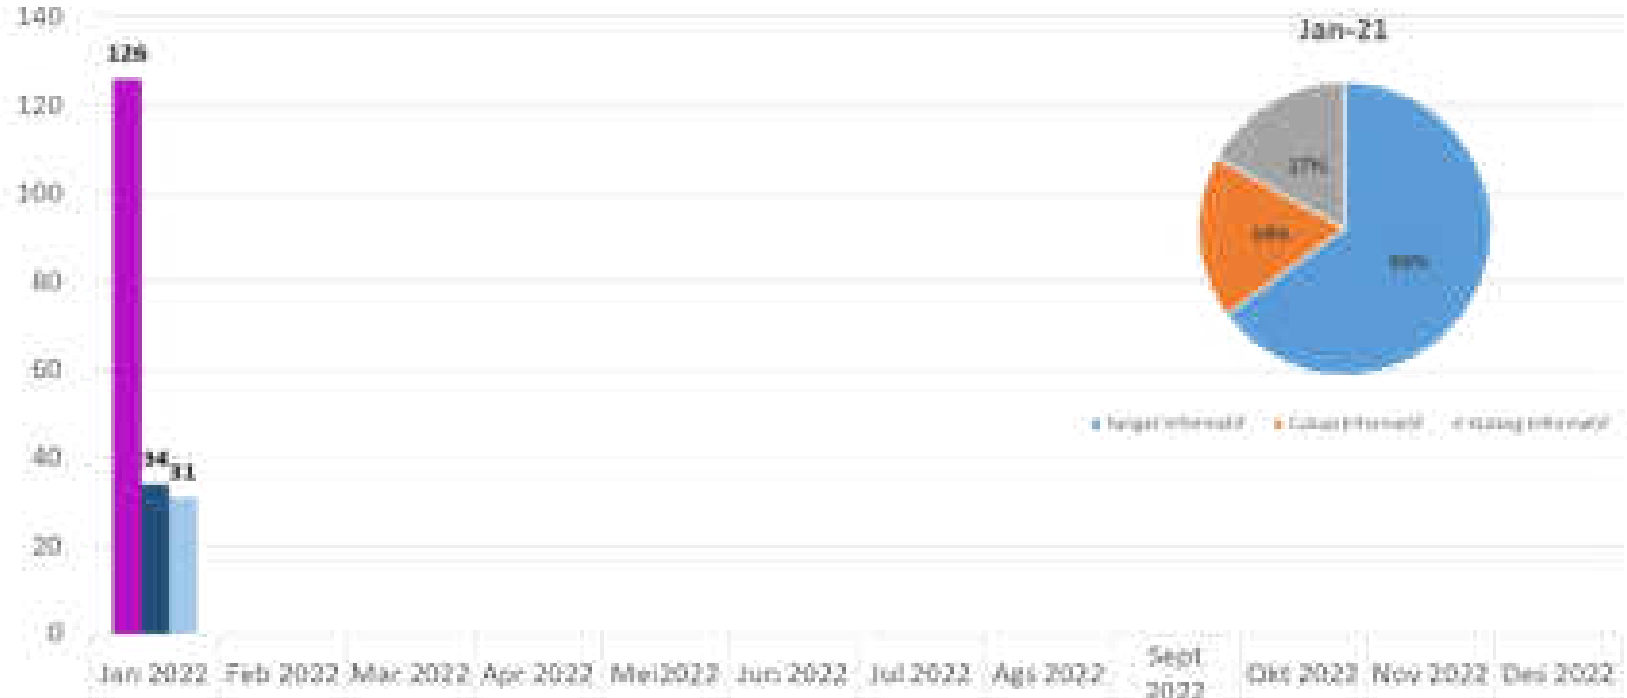

■ Sangat Informatif	126
■ Cukup Informatif	34
■ Kurang Informatif	31

Laporan Jumlah Akumulatif Pengunjung Website

Minggu IV





Terima
Kasih



RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR FEBRUARI 2022


**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



OUTLINE

1. Komposisi Anggaran TA 2022
2. Pelaporan Progres Realisasi Fisik & Anggaran Status Akhir Februari TA 2022
3. Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
5. Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2022

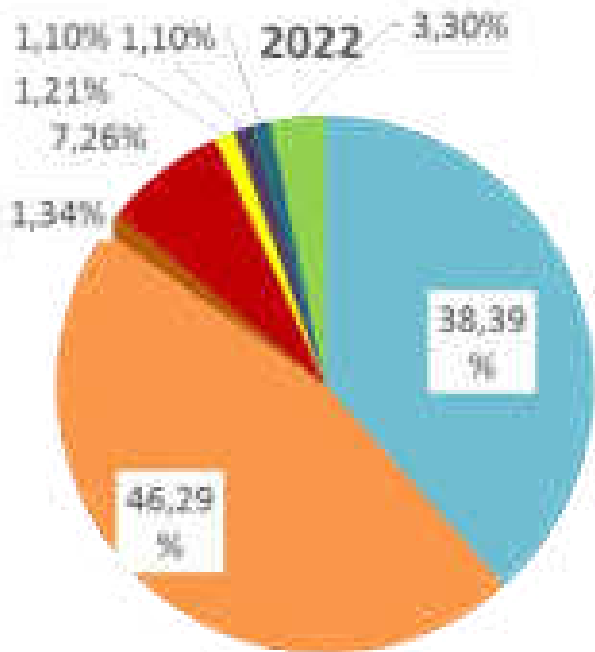

NO.	PROGRAM	2022	
		(%)	(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38,39	17.439.693.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	46,29	21.025.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,34	610.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7,26	3.300.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,30	1.500.000.000
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1,21	550.000.000
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,10	500.000.000
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1,10	500.000.000
	TOTAL	100	45.424.693.000




Realisasi Fisik & Anggaran APBD *)

Status Akhir Februari 2022

*)Realiasi keuangan diambil dari e-controlling Status 4 Maret 2022

*) Data Masuk dari Bidang status Jum'at 4 Maret 2022

Disperakim

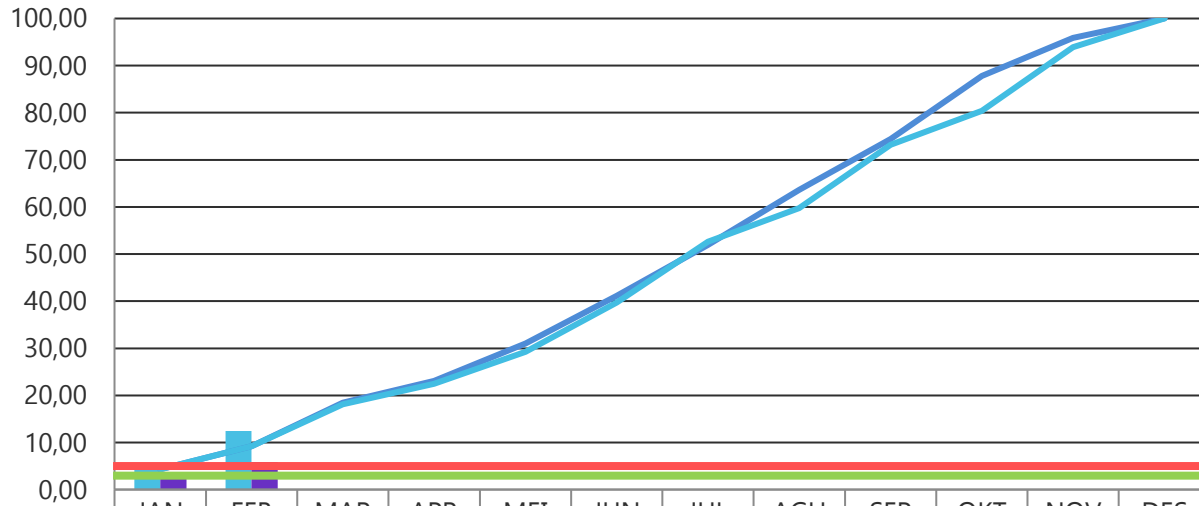


	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	4,52	12,46										
R.KEU	3,44	5,90										
T.FISIK	4,37	9,23	18,45	23,08	31,01	41,18	51,95	63,62	74,45	87,83	95,90	100,00
T.KEU	4,37	9,20	18,12	22,46	29,25	39,73	52,60	59,73	73,22	80,37	93,89	100,00

— Progres fisik Jateng
— Progres keu Jateng

	Feb	Maret (Prognosis)
Target Fisik	9,23	18,45
Target Keu	9,20	18,12
Real. Fisik	12,46	23,00
Real. Keu	5,90	22,65
Dev. Fisik	3,23	4,55
Dev. Keu	-3,30	4,52

PROVINSI JAWA TENGAH (Status 7 Maret 2022)	Target Fisik	6,1
	Target Keu	5,44
	Real. Fisik	5,29
	Real. Keu	3,82
	Dev. Fisik	-0,81
	Dev. Keu	-1,62


Sekretariat

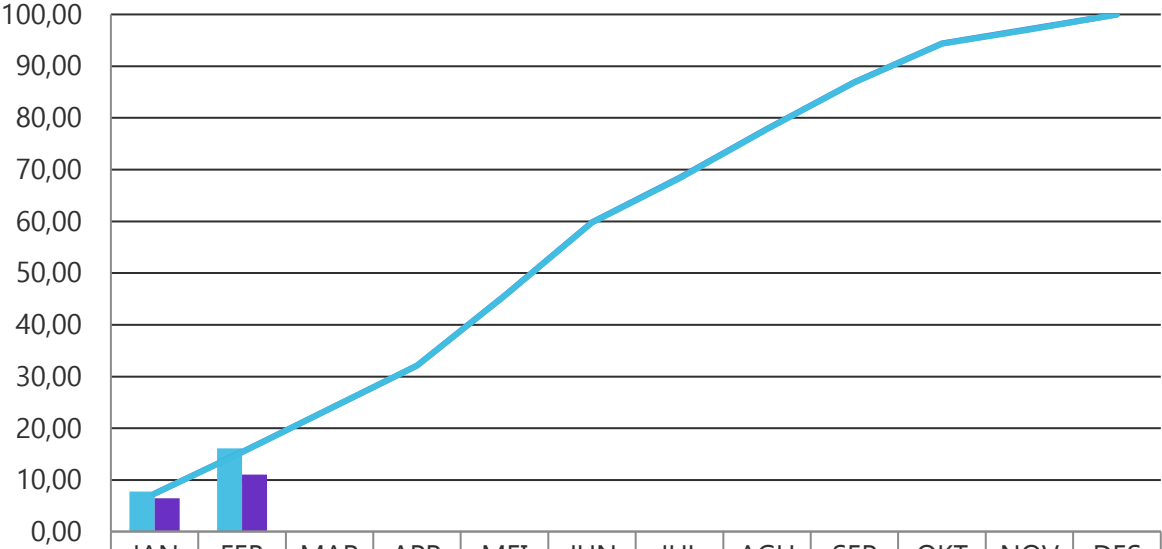

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	7,76	16,12										
R.KEU	6,43	11,04										
T.FISIK	7,36	15,37	23,78	32,11	45,67	59,81	68,40	77,91	86,93	94,42	97,20	100,0
T.KEU	7,36	15,36	23,77	32,12	45,60	59,75	68,32	77,82	86,85	94,34	97,08	100,0

	Feb	Mar (Prognosis)
Target Fisik	15,37	23,78
Target Keu	15,36	23,77
Real. Fisik	16,12	23,96
Real. Keu	11,04	23,84
Dev. Fisik	0,75	0,18
Dev. Keu	-4,32	0,08


Bidang Perumahan

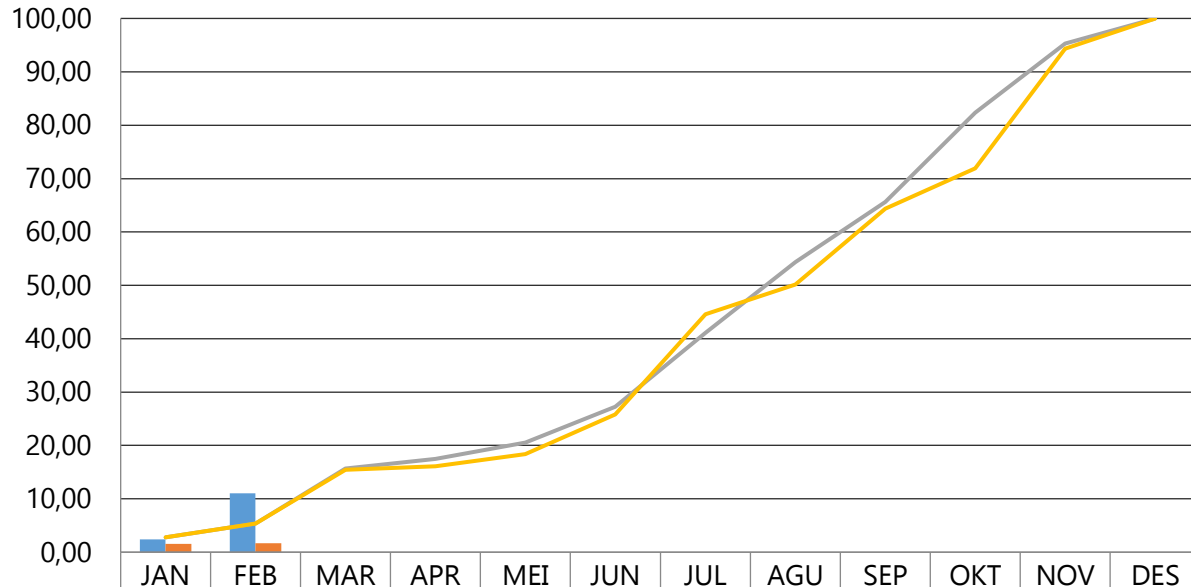

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	2,37	11,03										
R.KEU	1,58	1,69										
T.FISIK	2,80	5,38	15,69	17,46	20,53	27,24	41,08	54,33	65,65	82,34	95,29	100,00
T.KEU	2,80	5,34	15,41	16,09	18,36	25,84	44,55	50,16	64,35	71,90	94,32	100,00

	Feb	Maret (Prognosis)
Target Fisik	5,38	15,69
Target Keu	5,34	15,41
Real. Fisik	11,03	25,43
Real. Keu	1,69	25,05
Dev. Fisik	5,65	9,74
Dev. Keu	-3,65	9,65


Bidang Kawasan Permukiman

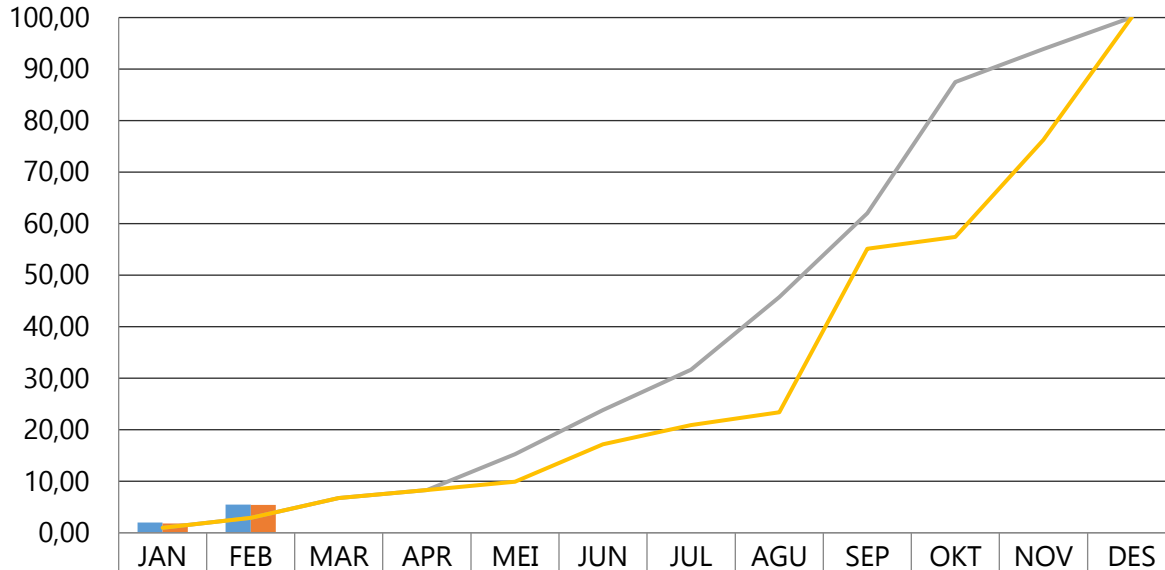

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	2,02	5,48										
R.KEU	1,81	5,44										
T.FISIK	1,02	2,91	6,76	8,32	15,27	23,87	31,65	45,78	62,01	87,49	93,91	100,0
T.KEU	1,02	2,91	6,76	8,32	9,90	17,22	20,91	23,40	55,11	57,44	76,26	100,0

	Feb	Maret (Prognosis)
Target Fisik	2,91	6,76
Target Keu	2,91	6,76
Real. Fisik	5,48	7,74
Real. Keu	5,44	7,74
Dev. Fisik	2,57	0,98
Dev. Keu	2,53	0,98


Bidang Pertanahan

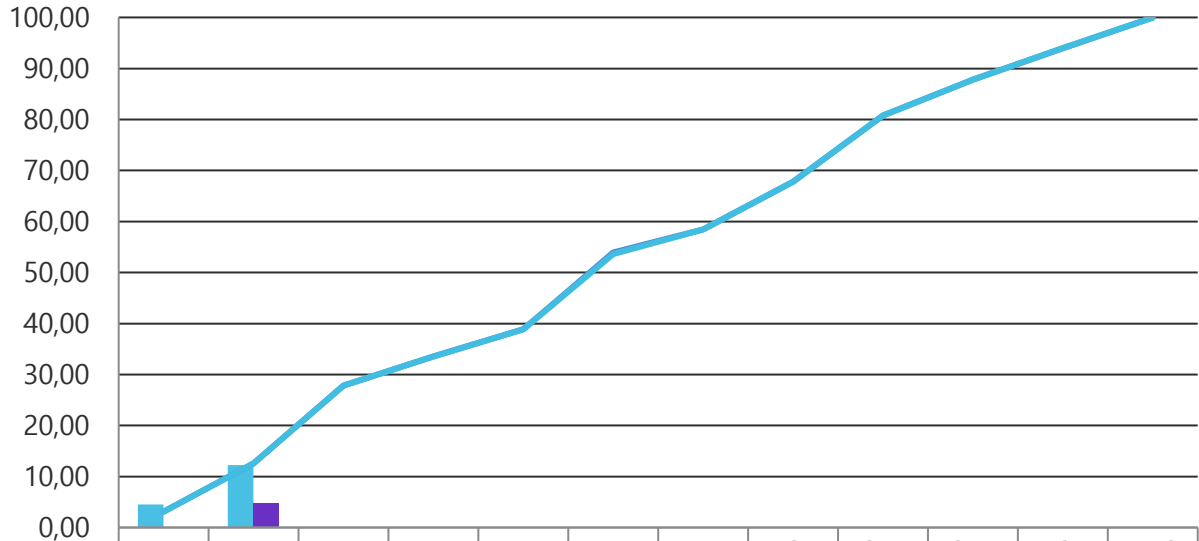

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	4,52	12,24										
R.KEU	0,00	4,77										
T.FISIK	3,14	12,59	27,82	33,53	38,90	53,94	58,44	67,79	80,80	87,79	93,99	100,00
T.KEU	3,14	12,60	27,82	33,54	38,90	53,64	58,45	67,79	80,80	87,80	94,00	100,00

	Feb	Maret (Prognosis)
Target Fisik	12,59	27,82
Target Keu	12,60	27,82
Real. Fisik	12,24	23,11
Real. Keu	4,77	21,14
Dev. Fisik	-0,35	-4,71
Dev. Keu	-7,83	-6,68

Bidang Keterpaduan PKP

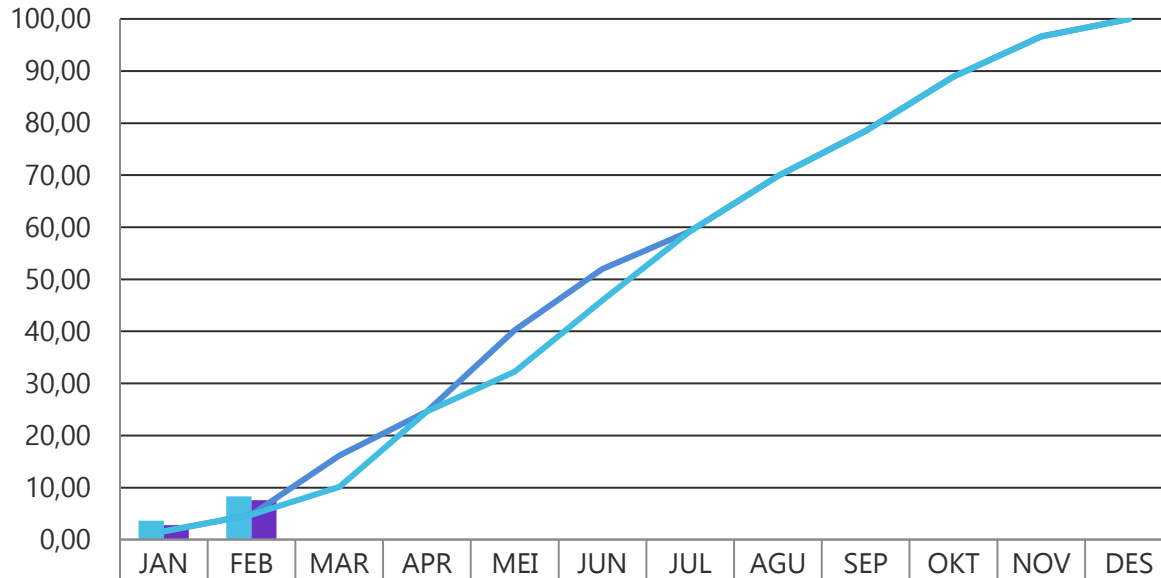

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,61	8,32										
R.KEU	2,79	7,56										
T.FISIK	1,56	4,75	16,14	24,66	40,26	51,98	59,26	69,85	78,50	88,93	96,64	100,0
T.KEU	1,56	4,75	10,14	24,65	32,26	45,98	59,26	69,85	78,50	88,92	96,64	100,0

	Feb	Maret (Prognosis)
Target Fisik	4,75	16,14
Target Keu	4,75	10,14
Real. Fisik	8,32	17,59
Real. Keu	7,56	15,37
Dev. Fisik	3,57	1,45
Dev. Keu	2,81	5,23



PELAPORAN PROGRES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Status Akhir Februari 2022

*) Data Masuk dari Bidang status Jum'at 4 Maret 2022

Bidang Perumahan

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 14/19 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banjarnegara	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
2		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banyumas	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
3		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
4		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Boyolali	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
5		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Brebes	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
6		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Demak	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
7		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Karanganyar	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
8		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kebumen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
9		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
10		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Klaten	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
11	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
12		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pati	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
13		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pekalongan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
14		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pemalang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
15		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Purbalingga	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
16		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Rembang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
17		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Sragen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
18		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
19		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Wonosobo	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)

Swakelola Tipe IV

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Tumanggal Kabupaten Purbalingga	120.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 23 Februari 2022	23 Februari 2022 - 22 Juli 2022 (150 hari)
2		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Jeruksari Kabupaten Pekalongan	144.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
3		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bongas Kabupaten Pemalang	48.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 2 Maret 2022	2 Maret 2022 - 29 Juli 2022 (150 hari)
4		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Sriwulan Kabupaten Demak	144.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
5		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Blerong Kabupaten Demak	72.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 4 Maret 2022	4 Maret 2022 - 31 Juli 2022 (150 hari)
6		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bedono Kabupaten Demak	84.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
7	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga	200.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (1 orang penerima bantuan mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
8		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Kebumen	250.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
9		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purworejo	150.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
10		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Boyolali	200.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	1.000.000.000	Tender		Oktober - Desember
2		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	60.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
3		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	60.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
4		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	80.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
5		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
6		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
7		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
8		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
9		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
10		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
11		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
12		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
13		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Pekalongan	1.015.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
14		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Wonogiri	945.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
15		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Tegal	210.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22

Bidang Kawasan Permukiman

Tender & Seleksi

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 (LIMA BELAS) HA						
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	50.000.000	Pengadaan Langsung		April
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 1)	500.000.000	Tender		Juli
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 2)	400.000.000	Tender		Juli
4		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 3)	250.000.000	Tender		Juli

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
5		Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	Seleksi		Mei
6		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	Seleksi		Mei
7		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	Seleksi		Mei
8		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Evaluasi Penawaran	April
9		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Evaluasi Penawaran	April
10		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 1)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
11		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 2)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli

Pengadaan Langsung

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
12		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 3)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
13		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
14		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung		Juli

Bidang Keterpaduan PKP

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH						
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi dan Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 1 Maret 2022	Maret-Desember
2		Konsultan Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	100.000.000	Tender	Penyusunan KAK & HPS	Maret
3		Konsultan Penyusunan Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Tender	Penyusunan KAK & HPS	Maret
4		Konsultan Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Tender	Penyusunan KAK & HPS	Maret
5		Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan	100.000.000	Seleksi		April
6		Konsultan Individual Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	42.000.000	Seleksi	Penyusunan KAK & HPS	Maret

Sekretariat

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	150.000.000	Pengadaan Langsung		

Realisasi Belanja Blangkon



	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
SEKRETARIAT	0										
PERUMAHAN	4.983.000										
KAWASAN	14.039.518										
PERTANAHAN	15.180.000										
KETERPADUAN	16.892.000										


*) Data Masuk dari Bidang status Jum'at 4 Maret 2022



PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

Status Akhir Februari 2022

Respon Laporgub

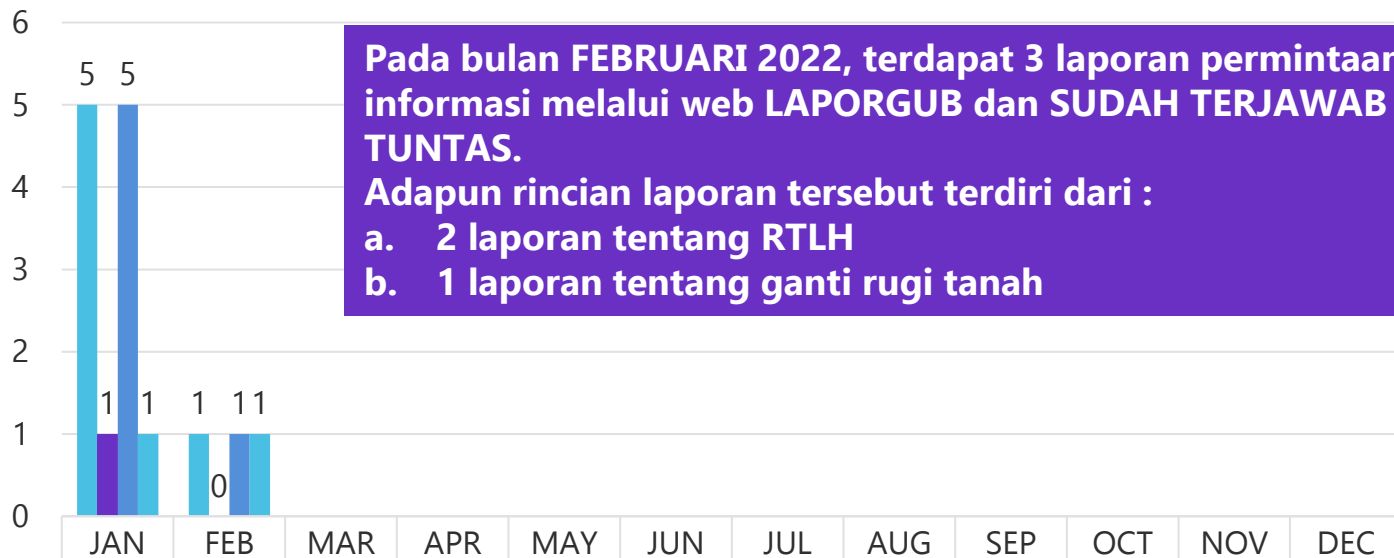

Pada bulan FEBRUARI 2022, terdapat 3 laporan permintaan informasi melalui web LAPORGUB dan SUDAH TERJAWAB TUNTAS.

Adapun rincian laporan tersebut terdiri dari :

- a. 2 laporan tentang RTLH**
- b. 1 laporan tentang ganti rugi tanah**

TOTAL

12

Laporan Jumlah Akumulatif Pengunjung Website

Minggu IV





Terima
Kasih
